



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

SECRETARIA EXECUTIVA
ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS


Ofício nº 120/2019/APM

Pato Branco, 23 de outubro de 2019.

Senhor Presidente,

Informamos aos ilustres vereadores, o envio de respostas relativas aos requerimentos: 1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 1936, 1937, 1939, 1940, 1942, 1943, 1947, 1948, 1951/2019, constantes do Ofício nº 692/2019-DL, de 17 de setembro de 2019.

Respeitosamente



CLEVERSON MALAGI
Assessor de Programas e Metas

A Sua Excelência o Senhor
VILMAR MACCARI
Presidente da Câmara Municipal
Pato Branco – PR

Câmara Municipal de Pato Branco



PROTOCOLO GERAL 3606/2019
Data: 24/10/2019 - Horário: 15:27
Administrativo



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e Obras

Ofício nº 099/2019 - SEO

Pato Branco, 18 de outubro de 2019.

Senhor Presidente,

Encaminhamos as respostas das proposições relativas ao Ofício nº 692/2019.

Proposição nº 1927/2019 - José Gilson Feitosa da Silva- PT

Requer a tomada de providências e notificação direcionada à empresa contratada solicitando os reparos no asfalto da Rua Andorinhas, Bairro Paulo Afonso.

Resposta: Conforme solicitado, documentação em anexo.

Proposição nº 1930/2019 - Ronalce Moacir Dalchiavan - PP

Requer pavimentação asfáltica na Rua Brasília, entre as Ruas Olindo Setti e José Catani, no Bairro Pinheiros.

Resposta: Verificado que a rua em questão, não está nos projetos de asfalto em andamento, desta forma a solicitação foi incluída na lista de espera, aguardando novos recursos para análise e demais procedimentos se necessário.

Proposição nº 1931/2019 - Ronalce Moacir Dalchiavan - PP

Requer seja feita pavimentação asfáltica urgente na Rua Eptácio Pessoa, no Bairro Vila Isabel.

Resposta: Verificado que a rua em questão, não está nos projetos de asfalto em andamento, desta forma a solicitação foi incluída na lista de espera, aguardando novos recursos para análise e demais procedimentos se necessário.

Proposição nº 1935/2019 -

Requer a inclusão da Rua Emília Rosa Petrobelli - Loteamento Paulo Afonso, no Programa Asfalto100%.

Resposta: Verificado que a rua em questão, não está nos projetos de asfalto em andamento, desta forma a solicitação foi incluída na lista de espera, aguardando novos recursos para análise e demais procedimentos se necessário.

Proposição nº1936 /2019 - Rodrigo José Correia - PSC

Requer a inclusão da Rua Deodora Kogi Loteamento Paulo Afonso no Programa Asfalto100%.

Resposta: Verificado que a rua em questão, não está nos projetos de asfalto em andamento, desta forma a solicitação foi incluída na lista de espera, aguardando novos recursos para análise e demais procedimentos se necessário.

Proposição nº1940 /2019 - Rodrigo José Correia - PSC

Requer com urgência operação tapa-buracos na Rua Padre Anchieta entre as Ruas Paraná e Marechal Costa e Silva - Bairro Sambugaro.

Resposta: Solicitação encaminhada para o departamento de obras para execução do serviço.

Proposição nº 1942/2019 - José Gilson Feitosa da Silva - PT

Requer que as providências tomadas para a pavimentação asfáltica nas Ruas Andorinhas e Alexandre Popia, Bairro Paulo Afonso, assim como cópia do projeto para efetivação das obra.

Resposta: Essas ruas fazem parte da próxima etapa do programa de asfalto, o projeto está elaborado, entretanto até o momento não se tem recursos disponível para sua execução. Assim que a verba estiver disponível o projeto será revisado e encaminhado para abertura de processo licitatório.

Proposição nº 1948/2019 - Joecir Bernardi - SD

Requer seja analisada a possibilidade de colocação de redutor de velocidade no asfalto da Comunidade do Passo da Ilha, próximo às residências dos Senhores Itacir Viganó e Dimas Pagnoncelli.

Resposta: Solicitação encaminhada para o Departamento de Trânsito que está verificando a possibilidade de atendimento ou indicando outro tipo de alteração no local que atenda a necessidade.

Proposição nº1951-Vilmar Maccari – PDT

Solicita ao Executivo Municipal para que realize com urgência a revitalização do Prolongamento da Avenida Tupi sentido Encruzilhada.

Resposta: Executado manutenção.

Respeitosamente,



Frederico Demario Pimpão
Secretario de Engenharia e Obras
Port. 368/2014

A Sua Excelência o Senhor
Vilmar Maccari
Presidente da Câmara Municipal
Pato Branco – PR



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

Pato Branco, 18 de outubro de 2019.

PARA
Siza Construtora Ltda Eireli
CNPJ: 06.907.354/0001-09
PATO BRANCO - PR.

NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Caramuru, 271, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 76.995.448/0004-54, vem respeitosamente, visando prevenir responsabilidades e resguardar direitos, **NOTIFICAR** Vossa Senhoria, conforme Contrato Nº 59/2017-GP, que tem como objeto a contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução dos serviços de recapeamento asfáltico sobre poliédrico, com área total de 7.625,05m², em atendimento ao Contrato de Repasse nº834419/2016, Processo nº 1034773-49/2016 - MCIDADES, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Pato Branco, tendo em vista que:

De acordo com os incisos I e III da Cláusula Décima terceira, que trata das Obrigações da Garantia dos Serviços e Materiais:

- I - A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por Conta da Contratada, ficando sujeito às penalidades aplicáveis a inadimplência;
- III - A contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período de 60 (sessenta) meses

Foi constatada em vistoria in loco que a Rua das Andorinhas (entre a Rua Édmo Pasto e a Rua Arquimedes Gobatto) apresenta defeitos na pavimentação asfáltica.



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

A empresa tem 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento deste para apresentar defesa prévia, que poderá ser acatada ou não, a critério da Secretaria de Engenharia e Obras.



Frederico Demario Pimpão
Gestor do Contrato
Município de Pato Branco

P. NOTIFICAÇÃO,

Ciente em : _____ / _____ / _____ horário _____

Nome: _____

Assinatura: _____

RG nº _____



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Secretaria de Administração e Finanças
Divisão de Licitações

5605P
Município de Pato Branco
Fls. 45 Visto

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2017

Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 59/2017, que entre si celebram o *Município de Pato Branco e Siza Construtora Ltda - EPP* na forma que segue:

Pelo presente Termo, de um lado o *Município de Pato Branco*, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, centro, em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. *Augustinho Zucchi*, denominado **CONTRATANTE**, e *Siza Construtora Ltda - EPP*, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 06.907.354/0001-09, Inscrição Estadual nº 9031451377 com sede na Rua: José Leonardi, nº 225, Bairro: Aeroporto, CEP: 85.503-000, Fone: (46) 3224-1715 em Pato Branco - Paraná, neste ato representada por *Guilherme Elias Piassa*, portador do CPF nº 046.967.169-61, RG nº 7.144.527-5, residente e domiciliado em Rua: Silvio Vidal, nº 263 - Apto. 202, Centro, CEP: 85.505-010, em Pato Branco - Paraná, têm certo e ajustado o Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 59/2017, Licitação na modalidade **Concorrência nº 07/2017**, Processo nº 48/2017 que tem por objeto a contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de serviços de recapeamento asfáltico sobre poliédrico, em trechos das Ruas Roald Carraro, Luiz Morelato, Das Andorinhas, Silva Jardim e Carlos Tumelero e recape sobre pavimento asfáltico em trechos das Ruas Roald Carraro e Arthur Bernardes, com área total de 7.625,05 m², em atendimento ao Contrato de Repasse Nº 834419/2016, Processo nº 1034773-49/2016 - MCIDADES, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Pato Branco-PR, objetivando a execução de ações relativas ao Programa Planejamento Urbano.

Cláusula Primeira - Do Valor

Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente em seu Artigo 65, Inciso I, alínea "b" e § 1º, bem como a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, as partes pactuam Aditivo no valor de *R\$ 21.909,51 (vinte e um mil, novecentos e nove reais e cinquenta e um centavos)*, conforme ANEXO I - ITENS A SEREM ADITIVADOS, passando o valor do Contrato de *R\$ 399.143,74 (trezentos e noventa e nove mil, cento e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos)* para *R\$ 421.053,25 (quatrocentos e vinte e um mil, cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos)*, perfazendo um percentual de 5,48912781%.

Cláusula Segunda - Dotação Orçamentária

Para suporte da despesa será utilizada a Dotação Orçamentária: 0602 - Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos - 154510019.1.001000 - Departamento de Engenharia - 4490.5100 - Obras e Instalações (4602 - 311). Reserva de saldo 474.

Cláusula Terceira - Da Vigência

Permanecem em plena vigência as demais cláusulas e condições que não conflitam com o presente Termo. Assim, por estarem certos e ajustados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do Termo de Contrato e do presente Termo de Aditamento firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma:

Pato Branco, 11 de outubro de 2017.

Município de Pato Branco - Contratante
Augustinho Zucchi - Prefeito

Siza Construtora Ltda - EPP - Contratada
Guilherme Elias Piassa - Representante Legal

Ass. Jurídica



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Administração e Finanças
Divisão de Licitações

Município de Pato Branco
Fls. 46 Visto

ANEXO I - ITENS A SEREM ADITIVADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
	ITENS ADITADOS				
2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA				R\$ 959,40
2.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	R\$ 533,00	R\$ 1,80	R\$ 959,40
3	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO				R\$ 2.061,27
3.4	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	R\$ 15,99	R\$ 128,91	R\$ 2.061,27
4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3				R\$ 16,79
4.4	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	T	R\$ 15,99	R\$ 1,05	R\$ 16,79
5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DMT = CONF. QUANT.				R\$ 50,03
5.4	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M³	R\$ 33,58	R\$ 1,49	R\$ 50,03
6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C				R\$ 884,78
6.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	R\$ 533,00	R\$ 1,66	R\$ 884,78
7	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE				R\$ 16.536,23
7.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	T	R\$ 66,63	R\$ 248,18	R\$ 16.536,23
8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA				R\$ 141,25
8.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M³	R\$ 26,65	R\$ 5,30	R\$ 141,25
9	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA				R\$ 118,97
9.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M³XKM	R\$ 127,92	R\$ 0,93	R\$ 118,97
10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO				R\$ 607,76
10.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	R\$ 31,04	R\$ 19,58	R\$ 607,76
11	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA				R\$ 140,24
11.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	R\$ 0,60	R\$ 233,73	R\$ 140,24
12	FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILÍNDRICA PLACA SIN.				R\$ 392,79
12.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	UN.	R\$ 3,00	R\$ 130,93	R\$ 392,79
				TOTAL	R\$ 21.909,51



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Administração e Finanças
Divisão de Licitações

Município de Pato Branco
Fls. 38 Visto

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02/2017

Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 59/2017, que entre si celebram o *Município de Pato Branco e Siza Construtora Ltda - EPP* na forma que segue:

Pelo presente Termo, de um lado o *Município de Pato Branco*, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, centro, em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. *Augustinho Zucchi*, denominado **CONTRATANTE**, e *Siza Construtora Ltda - EPP*, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 06.907.354/0001-09, Inscrição Estadual nº 9031451377 com sede na Rua: José Leonardi, nº 225, Bairro: Aeroporto, CEP: 85.503-000, Fone: (46) 3224-1715 em Pato Branco - Paraná, neste ato representada por *Guilherme Elias Piassa*, portador do CPF nº 046.967.169-61, RG nº 7.144.527-5, residente e domiciliado em Rua: Silvío Vidal, nº 263 - Apto. 202, Centro, CEP: 85.505-010, em Pato Branco - Paraná, têm certo e ajustado o Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 59/2017, Licitação na modalidade **Concorrência nº 07/2017**, Processo nº 48/2017 que tem por objeto a contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de serviços de recapeamento asfáltico sobre poliédrico, em trechos das Ruas Roald Carraro, Luiz Morelato, Das Andorinhas, Silva Jardim e Carlos Tumelero e recape sobre pavimento asfáltico em trechos das Ruas Roald Carraro e Arthur Bernardes, com área total de 7.625,05 m², em atendimento ao Contrato de Repasse Nº 834419/2016, Processo nº 1034773-49/2016 - MCIDADES, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Pato Branco-PR, objetivando a execução de ações relativas ao Programa Planejamento Urbano.

Cláusula Primeira - Do Prazo

Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente em seu Artigo 57, § 1º, inciso II, bem como a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, através do protocolo 379532, as partes pactuam a prorrogação do prazo de **Vigência até 06 de março de 2018**.

Cláusula Segunda - Da Vigência

Permanecem em plena vigência as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. Assim, por estarem certos e ajustados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do Termo de Contrato e do presente Termo de Aditamento firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pato Branco, 19 de dezembro de 2017.

Município de Pato Branco - Contratante
Augustinho Zucchi - Prefeito

Siza Construtora Ltda - EPP - Contratada
Guilherme Elias Piassa - Representante Legal

Aprova do Teor Jurídico
PGMPB
Rubrica



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Administração e Finanças
Divisão de Licitações

Município de Pato Branco
Fls. 18 Visto

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03/2018

Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 59/2017, que entre si celebram o Município de Pato Branco e Siza Construtora Ltda - EPP na forma que segue:

Pelo presente Termo, de um lado o *Município de Pato Branco*, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, centro, em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. *Augustinho Zucchi*, denominado CONTRATANTE, e *Siza Construtora Ltda - EPP*, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 06.907.354/0001-09, Inscrição Estadual nº 9031451377 com sede na Rua: José Leonardi, nº 225, Bairro: Aeroporto, CEP: 85.503-000, Fone: (46) 3224-1715 em Pato Branco - Paraná, neste ato representada por *Guilherme Elias Plassa*, portador do CPF nº 046.967.169-61, RG nº 7.144.527-5, residente e domiciliado em Rua: Sílvia Vidal, nº 263 - Apto. 202, Centro, CEP: 85.505-010, em Pato Branco - Paraná, têm certo e ajustado o Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 59/2017, Licitação na modalidade Concorrência nº 07/2017, Processo nº 48/2017 que tem por objeto a contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de serviços de recapeamento asfáltico sobre polidédrico, em trechos das Ruas Roald Carraro, Luiz Morelatto, Das Andorinhas, Silva Jardim e Carlos Tumelero e recape sobre pavimento asfáltico em trechos das Ruas Roald Carraro e Arthur Bernardes, com área total de 7.625,05 m², em atendimento ao Contrato de Repasse Nº 834419/2016, Processo nº 1034773-49/2016 - MCIDADES, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Pato Branco-PR, objetivando a execução de ações relativas ao Programa Planejamento Urbano.

Cláusula Primeira - Do Prazo

Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente em seu Artigo 57, § 1º, inciso VI, bem como a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, através do protocolo 381950, as partes pactuam a prorrogação do prazo de *Vigência até 06 de junho de 2018*.

Cláusula Segunda - Da Vigência

Permanecem em plena vigência as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. Assim, por estarem certos e ajustados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do Termo de Contrato e do presente Termo de Aditamento firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pato Branco, 06 de março de 2018.

Município de Pato Branco - Contratante
Augustinho Zucchi - Prefeito

Siza Construtora Ltda - EPP - Contratada
Guilherme Elias Plassa - Representante Legal

Aprovado o Teor Jurídico
PGM/PB
Rubrica



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Secretaria de Administração e Finanças
Divisão de Licitações

Município de Pato Branco
Fls. 27 Visto

TERMO DE ADITAMENTO Nº 04/2018

Quarto Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 59/2017, que entre si celebram o Município de Pato Branco e Siza Construtora Ltda - EPP na forma que segue:

Pelo presente Termo, de um lado o *Município de Pato Branco*, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, centro, em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. *Augustinho Zucchi*, denominado CONTRATANTE, e *Siza Construtora Ltda - EPP*, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 06.907.354/0001-09, Inscrição Estadual nº 9031451377 com sede na Rua: José Leonardi, nº 225, Bairro: Aeroporto, CEP: 85.503-000, Fone: (46) 3224-1715 em Pato Branco - Paraná, neste ato representada por *Guilherme Elias Plassa*, portador do CPF nº 046.967.169-61, RG nº 7.144.527-5, residente e domiciliado em Rua: Silvio Vidal, nº 263 - Apto. 202, Centro, CEP: 85.505-010, em Pato Branco - Paraná, têm certo e ajustado o Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 59/2017, Licitação na modalidade Concorrência nº 07/2017, Processo nº 48/2017 que tem por objeto a contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de serviços de recapeamento asfáltico sobre poliédrico, em trechos das Ruas Roald Carraro, Luiz Morelato, Das Andorinhas, Silva Jardim e Carlos Tumelero e recape sobre pavimento asfáltico em trechos das Ruas Roald Carraro e Arthur Bernardes, com área total de 7.625,05 m², em atendimento ao Contrato de Repasse Nº 834419/2016, Processo nº 1034773-49/2016 - MCIDADES, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Pato Branco-PR, objetivando a execução de ações relativas ao Programa Planejamento Urbano.

Cláusula Primeira - Da Supressão de Valor

Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente em seu Artigo 65, Inciso I, "a", as partes pactuam supressão no valor de R\$ 709,61 (setecentos e nove reais e sessenta e um centavos), conforme ANEXO I - ITENS SUPRIMIDOS, perfazendo um percentual de 0,17778307133%. Sendo assim, o valor do contrato passa de R\$ 421.053,25 (quatrocentos e vinte e um mil cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos) para R\$ 420.343,64 (quatrocentos e vinte mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Cláusula Segunda - Da Vigência

Permanecem em plena vigência as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. Assim, por estarem certos e ajustados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do Termo de Contrato e do presente Termo de Aditamento firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pato Branco, 27 de março de 2018.

Município de Pato Branco - Contratante
Augustinho Zucchi - Prefeito

Siza Construtora Ltda - EPP - Contratada
Guilherme Elias Plassa - Representante Legal



MUNICÍPIO DE

PATO BRANCOSecretaria de Administração e Finanças
Divisão de Licitações

Município de Pato Branco

Fls. 28 Visto

ANEXO I – ITENS SUPRIMIDOS

17	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	0	0,00	0,00	647,83
17.3	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Édimo Pastro e a Rua Arquimedes Gobatto)	UN.	1,00	647,83	647,83
23	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	0	0,00	0,00	61,78
23.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim)	M²	1,00	61,78	61,78
TOTAL					R\$ 709,61

EJg

Rua Caramuru, 271 – 85.501-064 – Pato Branco – Paraná
Fone/Fax (46) 3220-1544 www.patobranco.pr.gov.brAprovação e Teor Jurídico
PGMPB
Rubrica _____



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Arariqbola, 94, Centro • CEP 85.501-280 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharla@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA

OBJETO: Execução de serviços de recapeamento asfáltico sobre poliédrico em trechos das ruas Roald Carraro, Luiz Morelato, Das Andorinhas, Silva Jardim e Carlos Tumelero e recape sobre pavimento asfáltico nas ruas Roald Carraro e Arthur Bernardes, com área total de 7.625,05m², em atendimento ao contrato de repasse N° 834419/2016, Processo N° 1034773-49/2016 - MCIDADES, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Pato Branco-PR. E aditivo N°01 com 533,00m².

NOME DA EMPRESA CONTRATADA: Siza Construtora Ltda - EPP
CNPJ: 06.907.354/0001-09

DADOS CONTRATUAIS:

CONTRATO NÚMERO: 59/2017

DATA ASSINATURA: 11 de maio de 2017.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 421.053,25 (Quatrocentos e vinte e um mil, cinquenta e três reais com vinte e cinco centavos).

DISCRIMINAÇÃO DO FORNECIMENTO:

QUANTIDADE/DESCRIÇÃO: 8.158,05m²

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO:

Declara aceitação PROVISÓRIA do objeto identificado neste Termo, atestando que atendem plenamente às especificações do Objeto Contratual, os quais serão utilizados por um período de teste.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:

Engenheiro Civil: Frederico Demario Pimpão

Assinatura:

Município de Pato Branco
Frederico Demario Pimpão
Secretário de Engenharia e Obras
Port. 368/2014

Pato Branco, 08 de dezembro de 2017.



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Ararigbola, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharla@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

DADOS CONTRATUAIS:
CONTRATO NÚMERO: 59/2017
DATA ASSINATURA: 11 de Maio de 2017

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 420.343,64 (quatrocentos e vinte mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

NOME DA EMPRESA CONTRATADA: Siza Construtora Ltda - EPP.

OBJETO: Execução de serviços de recapeamento asfáltico sobre poliédrico, em trechos das Ruas Roald Carraro, Luiz Morelatto, Das Andorinhas, Silva Jardim e Carlos Tumelero e recape sobre pavimento asfáltico em trechos das Ruas Roald Carraro e Arthur Bernardes.

DISCRIMINAÇÃO DO FORNECIMENTO:
QUANTIDADE/DESCRIÇÃO: 7.625,05m².

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO:

Declara aceitação DEFINITIVA do objeto identificado neste Termo, atestando que atendem plenamente às especificações do Objeto Contratual. Tal medida dá-se na observação da Cláusula de Garantia dos Serviços e Materiais do referido contrato.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Secretário de Engenharia e Obras – FREDERICO DEMARIO PIMPÃO –

Assinatura:

Município de Pato Branco
Frederico Demario Pimpão
Secretário de Engenharia e Obras
Pdt. 368/2014

Pato Branco, 16 de Abril de 2018.



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Ararigbolá, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Pato Branco, 25 de janeiro de 2018

LAUDO DE LIBERAÇÃO

ENGº FREDERICO DEMARIO PIMPÃO
Secret. Engenharia e Obras


Siza Construtora Ltda - EPP
CNPJ Nº 06.907.354/0001-09
Contrato nº 59/2017/GP

Recapeamento asfáltico sobre poliédrico, de trechos das Ruas Roal Carraro, Luiz Morelatto, Das Andorinhas, Silva Jardim e Carlos Tumelero e recape sobre pavimento asfáltico em trechos da Roald Carraro e Arthur Bernardes

CONTRATO	100%		399.143,74	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1.ª Parcela em 25/01/2018	76,46%	305.182,01	23,54%	R\$ 93.961,73

Valor a ser liberado em 25/01/2018 R\$ 305.182,01


Comissão de Recebimento de Bens e Serviços (Decreto Nº 8.234 de 04/12/17)



Gilvan Augusto Nava



Fernanda Zianni Manarim

Férias

Jorge Eduardo Chioqueta


Ricardo Luiz Amarante Zilio


Alana Paula Mulhmann


Radimir Odlen Comin


Claercio Gregorine

Município de Pato Branco
Autorizo, atendidas as
exigências legais

26 JAN. 2018


Augustinho Zucchi
Prefeito Municipal

Junco
26/01



Comissão de Recebimento de Bens e Serviços

**Recapeamento asfáltico sobre poliédrico, de trechos
das Ruas Roald Carraro, Luiz Morelatto, Das
Andorinhas, Silva Jardim e Carlos Tumelero e recape
sobre pavimento asfáltico em trechos da Roald
Carraro e Arthur Bernardes**

CONTRATO 59/2017/GP

Relatório de Medição nº 01

Empresa Contratada: Siza Construtora Ltda

Responsável: Guilherme Elias Piassa – CREA PR 86745/D


25/01/2018
Página 1 de 5


Município de Pato Branco
Frederico Denario Pimpão
Secretário de Engenharia e Obras
Port. 368/2014


No dia 28 de dezembro de 2017, foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra até o momento da vistoria:




Fotografia 01 – Rua Roald Carraro, entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim

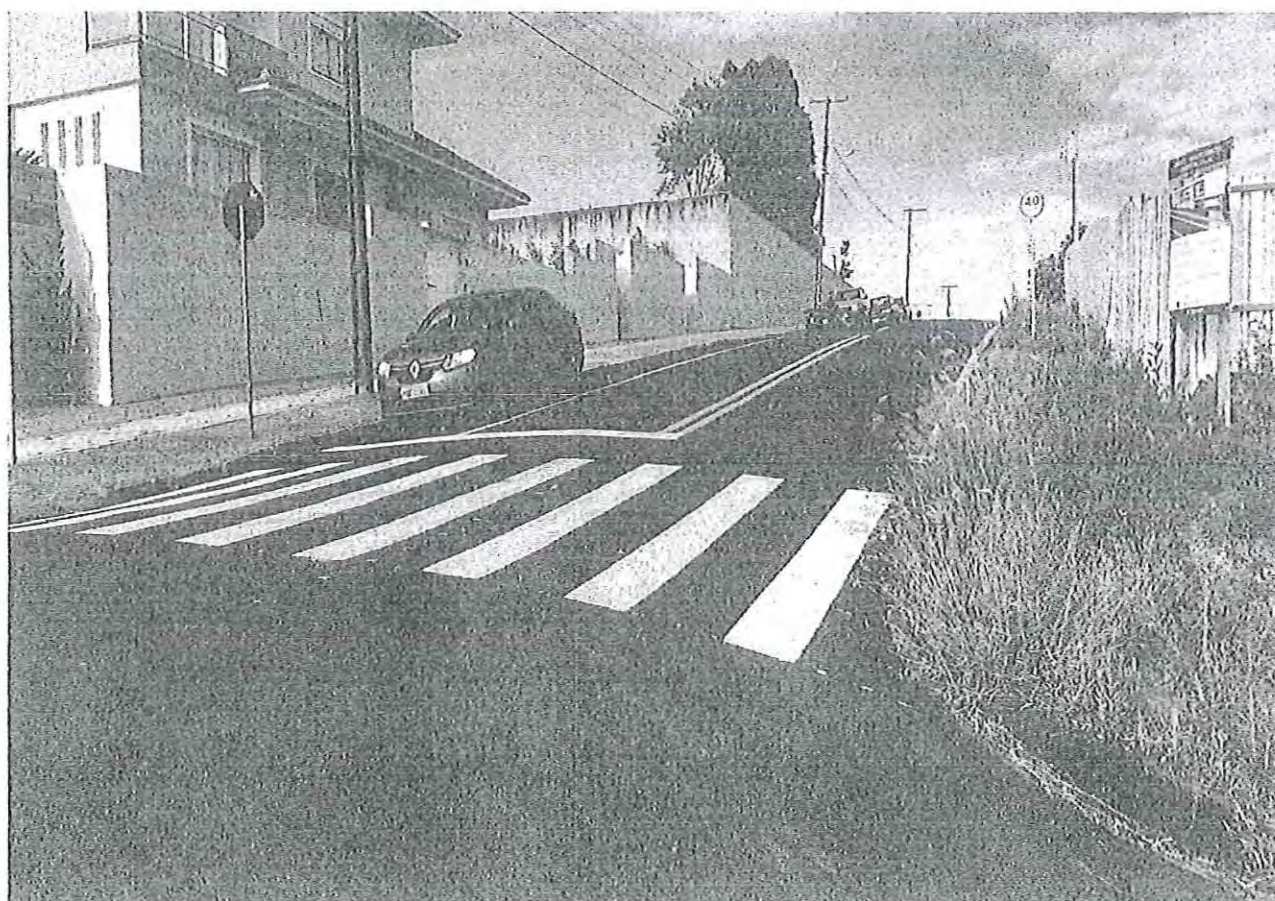


Fotografia 02 – Rua Roald Carraro, entre a Rua Aimoré e a Rua Arthur Bernardes

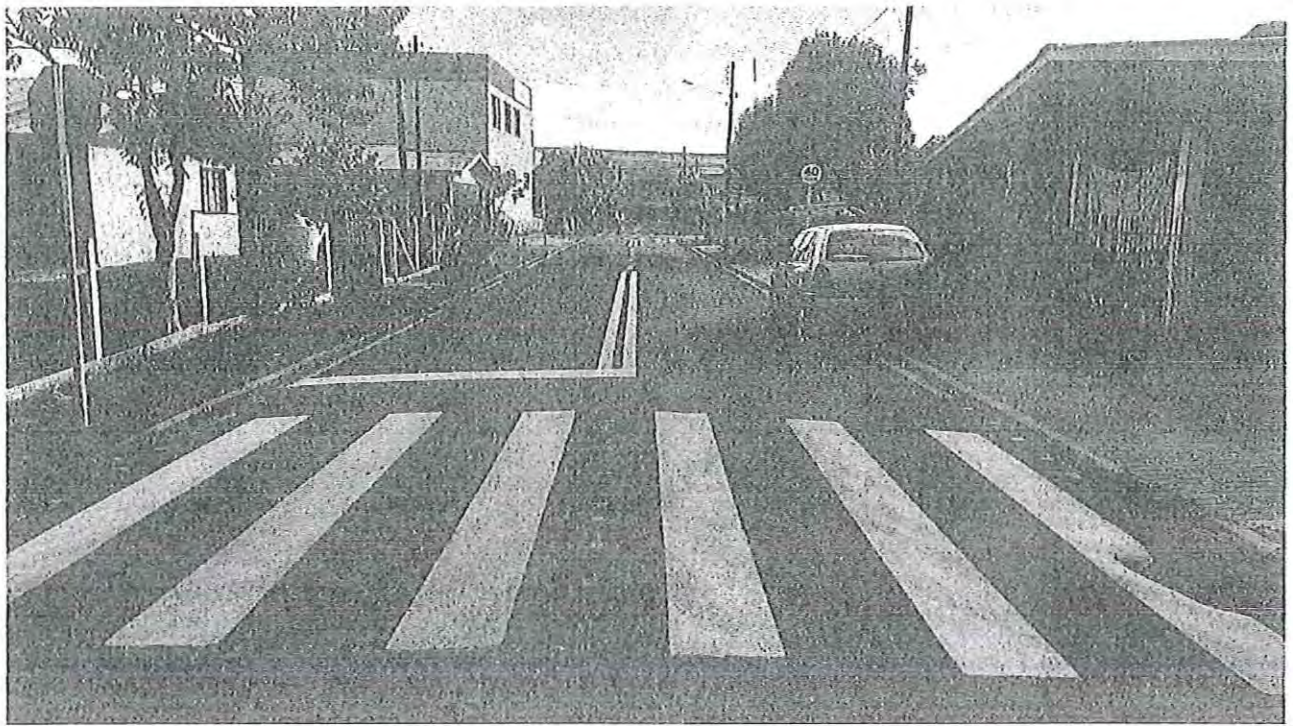

Fotografia 03 – Rua Luiz Morelato, entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau Fritz

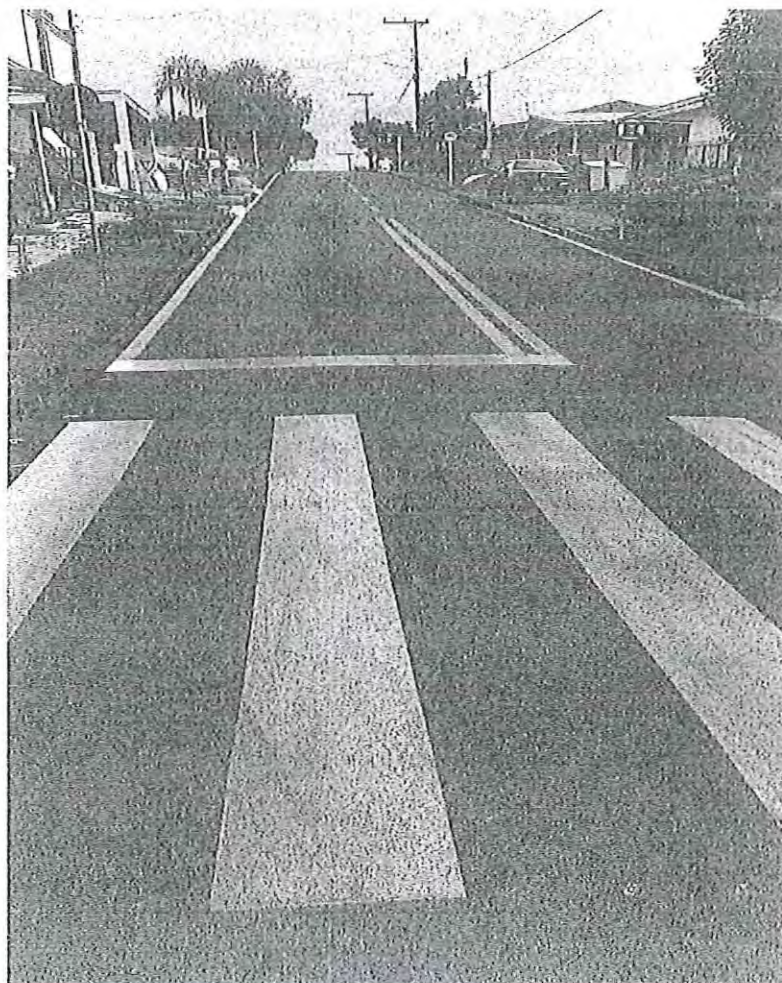

Fotografia 04 – Rua das Andorinhas, entre a Édimo Pastro e a Rua Arquimedes

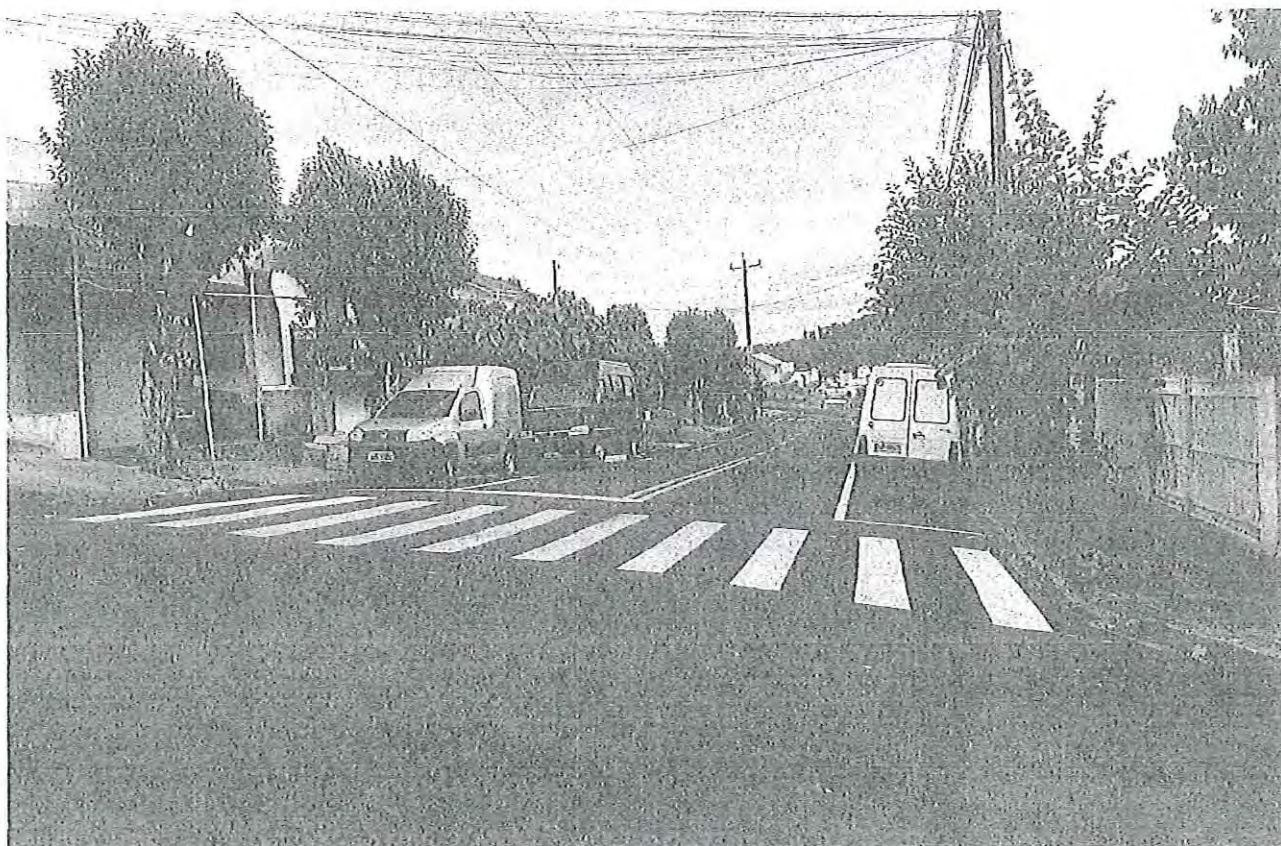

Fotografia 05 – Rua Silva Jardim, entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro



Fotografia 06 – Rua Arthur Bernardes, entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro




Fotografia 07 – Rua Carlos Tumelero, entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano Witiman

Conforme Cláusula Décima Primeira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição.

Não havendo nada mais a comentar referente às medições do Contrato 59/2017/GP e em conformidade com o Ofício nº 0115/2018/REGOV/CV da CAIXA segue parecer favorável a liberação de R\$ 305.182,01.

Pato Branco, 25 de Janeiro de 2018.


Frederico Demario Pimpão
Eng. Civil CREA-PR 26.495/D
Município de Pato Branco
Frederico Demario Pimpão
Secretário de Engenharia e Obras
Port. 368/2014

Nº do contrato: 1034773-49 / 2016

Tomador: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Programa: PLANEJAMENTO URBANO (MCIDADES)

Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DE PATO BRANCO

BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº:

1

Data da Medição:

8-nov-17

Período:

9-out-17 8-nov-17

Data de Início do Empreendimento:

09/10/17

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato do repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$		NO PERÍODO	CLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	R\$ 256.213,85		R\$ 7.714,79	R\$ 248.499,07	R\$ 248.499,07
				UNIT.	TOTAL						ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	CLOSADO	EFETIVO	ACUMULADO
					399.143,74										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				888,83					1,00	888,83		888,83	888,83	888,83
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,50	355,53	888,83	2,50		2,50	2,50	1,00	888,83		888,83	888,83	888,83
	LIMPEZA, FRESA, REFORÇO DE BASE, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE														
2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA				13.725,09					0,63	8.603,82		8.603,82	8.603,82	8.603,82
2.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	1.566,20	1,80	2.819,16	1.566,20		1.566,20	1.566,20	1,00	2.819,16		2.819,16	2.819,16	2.819,16
2.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	1.238,20	1,80	2.228,76	1.238,20		1.238,20	1.238,20	1,00	2.228,76		2.228,76	2.228,76	2.228,76
2.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	688,20	1,80	1.238,76										
2.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edmo Pastre e a Rua Arquimedes	M²	878,40	1,80	1.581,12										
2.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	882,00	1,80	1.587,60	882,00		882,00	882,00	1,00	1.587,60		1.587,60	1.587,60	1.587,60
2.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	1.093,50	1,80	1.968,30	1.093,50		1.093,50	1.093,50	1,00	1.968,30		1.968,30	1.968,30	1.968,30
2.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	1.278,55	1,80	2.301,39										
3	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO				11.714,06					1,00	11.714,06		11.714,06	11.714,06	11.714,06
3.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	20,91	128,91	2.695,51	20,91		20,91	20,91	1,00	2.695,51		2.695,51	2.695,51	2.695,51
3.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	37,15	128,91	4.789,01	37,15		37,15	37,15	1,00	4.789,01		4.789,01	4.789,01	4.789,01
3.3	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	32,81	128,91	4.229,54	32,81		32,81	32,81	1,00	4.229,54		4.229,54	4.229,54	4.229,54
4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO				95,42					1,00	95,42		95,42	95,42	95,42
4.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	20,91	1,05	21,96	20,91		20,91	20,91	1,00	21,96		21,96	21,96	21,96
4.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	37,15	1,05	39,01	37,15		37,15	37,15	1,00	39,01		39,01	39,01	39,01
4.3	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	32,81	1,05	34,45	32,81		32,81	32,81	1,00	34,45		34,45	34,45	34,45
5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA				287,42					1,00	287,42		287,42	287,42	287,42
5.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²XKM	46,00	1,49	68,54	46,00		46,00	46,00	1,00	68,54		68,54	68,54	68,54
5.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²XKM	78,01	1,49	116,23	78,01		78,01	78,01	1,00	116,23		116,23	116,23	116,23
5.3	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²XKM	68,89	1,49	102,65	68,89		68,89	68,89	1,00	102,65		102,65	102,65	102,65
6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C				20.287,52					0,53	10.841,62		10.841,62	10.841,62	10.841,62
6.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	2.435,40	1,66	4.042,76	2.435,40		2.435,40	2.435,40	1,00	4.042,76		4.042,76	4.042,76	4.042,76
6.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	1.238,20	1,66	2.055,41	1.238,20		1.238,20	1.238,20	1,00	2.055,41		2.055,41	2.055,41	2.055,41
6.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	1.376,40	1,66	2.284,82										
6.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edmo Pastre e a Rua Arquimedes	M²	1.756,80	1,66	2.916,29										
6.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	1.764,00	1,66	2.928,24	1.764,00		1.764,00	1.764,00	1,00	2.928,24		2.928,24	2.928,24	2.928,24
6.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	1.093,50	1,66	1.815,21	1.093,50		1.093,50	1.093,50	1,00	1.815,21		1.815,21	1.815,21	1.815,21
6.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	2.557,10	1,66	4.244,79										
7	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A				265.068,64					0,60	159.152,86		159.152,86	159.152,86	159.152,86
7.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	T	217,51	248,18	53.981,63	217,51		217,51	217,51	1,00	53.981,63		53.981,63	53.981,63	53.981,63
7.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	T	154,78	248,18	38.413,30	154,78		154,78	154,78	1,00	38.413,30		38.413,30	38.413,30	38.413,30
7.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	T	103,23	248,18	25.619,62										
7.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edmo Pastre e a Rua Arquimedes	T	131,76	248,18	32.700,20										
7.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	T	132,30	248,18	32.834,21	132,30		132,30	132,30	1,00	32.834,21		32.834,21	32.834,21	32.834,21
7.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	T	136,69	248,18	33.923,72	136,69		136,69	136,69	1,00	33.923,72		33.923,72	33.923,72	33.923,72

Tomador: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
 Programa: PLANEJAMENTO URBANO (MCIDADES)
 Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DE PATO BRANCO

Data da Medição: 8-nov-17
 Período: 9-out-17 8-nov-17
 Data de Início do Empreendimento: 09/10/17

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$ 399.143,74		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	R\$ 256.213,85	R\$ 256.213,85	R\$ 7.714,79	R\$ 248.499,07	R\$ 248.499,07
				UNIT.	TOTAL						ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADO
7.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	T	191,78	248,18	47.595,96										
8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE,				2.264,21					0,60		1.359,50		1.359,50	1.359,50
8.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	87,00	5,30	461,10	87,00		87,00	87,00	1,00		461,10		461,10	461,10
8.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	61,91	5,30	328,12	61,91		61,91	61,91	1,00		328,12		328,12	328,12
8.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	41,29	5,30	218,84										
8.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	M²	52,70	5,30	279,31										
8.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	52,92	5,30	280,48	52,92		52,92	52,92	1,00		280,48		280,48	280,48
8.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	54,68	5,30	289,80	54,68		54,68	54,68	1,00		289,80		289,80	289,80
8.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	76,71	5,30	406,56										
9	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA				1.726,54					0,67		1.158,07		1.158,07	1.158,07
9.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²XKM	426,31	0,93	396,47	426,31		426,31	426,31	1,00		396,47		396,47	396,47
9.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²XKM	297,17	0,93	276,37	297,17		297,17	297,17	1,00		276,37		276,37	276,37
9.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²XKM	128,01	0,93	119,05										
9.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	M²XKM	84,33	0,93	78,43										
9.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²XKM	259,31	0,93	241,16	259,31		259,31	259,31	1,00		241,16		241,16	241,16
9.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²XKM	262,44	0,93	244,07	262,44		262,44	262,44	1,00		244,07		244,07	244,07
9.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²XKM	398,91	0,93	370,99										
10	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE				11.293,35										
10.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	109,46	19,58	2.143,23										
10.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	86,52	19,58	1.694,06										
10.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	79,90	19,58	1.564,44										
10.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	M²	66,50	19,58	1.302,07										
10.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	60,06	19,58	1.175,97										
10.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	69,58	19,58	1.362,38										
10.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	104,76	19,58	2.051,20										
11	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA				2.227,44										
11.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	1,60	233,73	373,97										
11.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	1,00	233,73	233,73										
11.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	1,91	233,73	446,42										
11.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	M²	1,60	233,73	373,97										
11.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	0,40	233,73	93,49										
11.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	1,00	233,73	233,73										
11.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	2,02	233,73	472,13										
12	FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILINDRICA PLACA SIN.				6.022,78										
12.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	UN.	8,00	130,93	1.047,44										
12.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	UN.	5,00	130,93	654,65										
12.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	UN.	9,00	130,93	1.178,37										
12.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	UN.	8,00	130,93	1.047,44										
12.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	UN.	2,00	130,93	261,86										
12.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	UN.	5,00	130,93	654,65										
12.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	UN.	9,00	130,93	1.178,37										

Tomador: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
 Programa: PLANEJAMENTO URBANO (MCIDADES)
 Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DE PATO BRANCO

Data da Medição: 3-nov-17
 Período: 9-out-17 8-nov-17
 Data de Início do Empreendimento: 09/10/17

#VALOR	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS			QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS						
		UD	QUANT.	R\$ 399.143,74		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	256.213,85	R\$ 256.213,85	R\$ 7.714,79	R\$ 248.499,07	R\$ 248.499,07
				UNIT.	TOTAL										
	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS														
13	ESCAVAÇÃO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA				2.095,79					1,00		2.095,79		2.095,79	2.095,79
13.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	263,16	7,65	2.013,17	263,16		263,16	263,16	1,00		2.013,17		2.013,17	2.013,17
13.2	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	10,80	7,65	82,62	10,80		10,80	10,80	1,00		82,62		82,62	82,62
14	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA				4.010,39					1,00		4.010,39		4.010,39	4.010,39
14.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	228,76	16,82	3.847,74	228,76		228,76	228,76	1,00		3.847,74		3.847,74	3.847,74
14.2	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	9,67	16,82	162,65	9,67		9,67	9,67	1,00		162,65		162,65	162,65
15	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,				6.474,60					1,00		6.474,60		6.474,60	6.474,60
15.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M	51,00	107,91	5.503,41	51,00		51,00	51,00	1,00		5.503,41		5.503,41	5.503,41
15.2	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M	9,00	107,91	971,19	9,00		9,00	9,00	1,00		971,19		971,19	971,19
16	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,				17.016,12					1,00		17.016,12		17.016,12	17.016,12
16.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M	99,00	171,88	17.016,12	99,00		99,00	99,00	1,00		17.016,12		17.016,12	17.016,12
17	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,				11.660,94					0,72		11.660,94	3.239,15	8.421,79	8.421,79
17.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	UN.	10,00	647,83	6.478,30	10,00	3,00	7,00	7,00	0,70		6.478,30	1.943,49	4.534,81	4.534,81
17.2	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	UN.	2,00	647,83	1.295,66	2,00	1,00	1,00	1,00	0,50		1.295,66	647,83	647,83	647,83
17.3	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pastore e a Rua Arquimedes	UN.	2,00	647,83	1.295,66	2,00		2,00	2,00	1,00		1.295,66		1.295,66	1.295,66
17.4	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	UN.	2,00	647,83	1.295,66	2,00		2,00	2,00	1,00		1.295,66		1.295,66	1.295,66
17.5	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	UN.	2,00	647,83	1.295,66	2,00	1,00	1,00	1,00	0,50		1.295,66	647,83	647,83	647,83
18	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES				235,09					0,38		235,09	146,94	88,16	88,16
18.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M	0,90	97,95	88,16	0,90	0,90					88,16	88,16		
18.2	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M	0,60	97,95	58,77	0,60	0,30	0,30	0,30	0,50		58,77	29,39	29,39	29,39
18.3	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pastore e a Rua Arquimedes	M	0,60	97,95	58,77	0,60		0,60	0,60	1,00		58,77		58,77	58,77
18.4	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M	0,30	97,95	29,39	0,30	0,30					29,39	29,39		
19	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01				352,11										
19.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	UN.	1,00	352,11	352,11										
	REPARO DE MEIO FIO, BOCA DE LOBO E ACESSIBILIDADE														
20	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE				1.078,08										
20.1	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	UN.	2,00	539,04	1.078,08										
21	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO				3.294,40					0,82		3.294,40	593,92	2.700,48	2.700,48
21.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M	27,00	9,28	250,56	27,00	27,00					250,56	250,56		
21.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M	6,00	9,28	55,68	6,00	6,00					55,68	55,68		
21.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M	77,00	9,28	714,56	77,00		77,00	77,00	1,00		714,56		714,56	714,56
21.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pastore e a Rua Arquimedes	M	85,00	9,28	788,80	85,00	22,00	63,00	63,00	0,74		788,80	204,16	584,64	584,64
21.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M	40,00	9,28	371,20	40,00		40,00	40,00	1,00		371,20		371,20	371,20
21.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M	75,00	9,28	696,00	75,00	5,00	70,00	70,00	0,93		696,00	46,40	649,60	649,60
21.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M	45,00	9,28	417,60	45,00	4,00	41,00	41,00	0,91		417,60	37,12	380,48	380,48
22	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,				16.954,24					0,79		16.954,24	3.549,44	13.404,80	13.404,80
22.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M	43,00	37,76	1.623,68	43,00	43,00					1.623,68	1.623,68		

Tomador: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
 Programa: PLANEJAMENTO URBANO (MCIDADES)
 Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DE PATO BRANCO

Data da Medição: 8-nov-17
 Período: 9-out-17 8-nov-17
 Data de Início do Empreendimento: 09/10/17

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$ 399.143,74		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	256.213,85	R\$ 256.213,85	R\$ 7.714,79	R\$ 248.499,07	R\$ 248.499,07
				UNIT.	TOTAL										
22.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M	13,00	37,76	490,88	13,00	13,00					490,88	490,88		
22.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M	81,00	37,76	3.058,56	81,00		81,00	81,00	1,00		3.058,56		3.058,56	3.058,56
22.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pastró e a Rua Arquimedes	M	115,00	37,76	4.342,40	115,00	22,00	93,00	93,00	0,81		4.342,40	830,72	3.511,68	3.511,68
22.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M	60,00	37,76	2.265,60	60,00		60,00	60,00	1,00		2.265,60		2.265,60	2.265,60
22.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M	84,00	37,76	3.171,84	84,00	12,00	72,00	72,00	0,86		3.171,84	453,12	2.718,72	2.718,72
22.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M	53,00	37,76	2.001,28	53,00	4,00	49,00	49,00	0,92		2.001,28	151,04	1.850,24	1.850,24
23	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO				370,68					0,50		370,68	185,34	185,34	185,34
23.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	1,00	61,78	61,78	1,00	1,00					61,78	61,78		
23.2	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	2,00	61,78	123,56	2,00	1,00	1,00	1,00	0,50		123,56	61,78	61,78	61,78
23.3	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	1,00	61,78	61,78	1,00	1,00					61,78	61,78		
23.4	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	1,00	61,78	61,78	1,00		1,00	1,00	1,00		61,78		61,78	61,78
23.5	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	1,00	61,78	61,78	1,00		1,00	1,00	1,00		61,78		61,78	61,78
Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.															

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
 Carimbo e a Assinatura

Município de Pato Branco
 Frederico Demario Pimpão
 Secretário de Engenharia e Obras
 Port. 368/2014

Responsável Executor
 Carimbo e a Assinatura

Nº do contrato: 1034773-49 / 2016

Tomador: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Programa: PLANEJAMENTO URBANO (MCIDADES)

Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DE PATO BRANCO

BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº:

2

Data da Medição:

8-dez-17

Período:

8-nov-17

8-dez-17

Data de Início do Empreendimento:

09/10/17

#VALOR!	Declararam que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS						
		UD	QUANT.	R\$		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	142.929,89		R\$ 142.929,89	R\$ 86.246,94	R\$ 56.682,96	R\$ 305.182,06
				UNIT.	TOTAL						ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO				
					399.143,74											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				888,83					1,00	888,83					888,83
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,50	355,53	888,83				2,50	1,00	888,83					888,83
	LIMPEZA, FRESA, REFORÇO DE BASE, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE															
2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA				13.725,09					1,00	8.603,82	5.121,27			5.121,27	13.725,09
2.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	1.566,20	1,80	2.819,16				1.566,20	1,00	2.819,16					2.819,16
2.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	1.238,20	1,80	2.228,76				1.238,20	1,00	2.228,76					2.228,76
2.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	688,20	1,80	1.238,76	688,20		688,20	688,20	1,00		1.238,76			1.238,76	1.238,76
2.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edmo Pasto e a Rua Arquimedes	M²	878,40	1,80	1.581,12	878,40		878,40	878,40	1,00		1.581,12			1.581,12	1.581,12
2.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	882,00	1,80	1.587,60				882,00	1,00	1.587,60					1.587,60
2.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	1.093,50	1,80	1.968,30				1.093,50	1,00	1.968,30					1.968,30
2.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	1.278,55	1,80	2.301,39	1.278,55		1.278,55	1.278,55	1,00		2.301,39			2.301,39	2.301,39
3	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO				11.714,06					1,00	11.714,06					11.714,06
3.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	20,91	128,91	2.695,51				20,91	1,00	2.695,51					2.695,51
3.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	37,15	128,91	4.789,01				37,15	1,00	4.789,01					4.789,01
3.3	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	32,81	128,91	4.229,54				32,81	1,00	4.229,54					4.229,54
4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO				95,42					1,00	95,42					95,42
4.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	20,91	1,05	21,96				20,91	1,00	21,96					21,96
4.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	37,15	1,05	39,01				37,15	1,00	39,01					39,01
4.3	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	32,81	1,05	34,45				32,81	1,00	34,45					34,45
5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA				287,42					1,00	287,42					287,42
5.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²XKM	46,00	1,49	68,54				46,00	1,00	68,54					68,54
5.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²XKM	78,01	1,49	116,23				78,01	1,00	116,23					116,23
5.3	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²XKM	68,89	1,49	102,65				68,89	1,00	102,65					102,65
6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C				20.287,52					0,66	10.341,64	9.445,90		5.378,96	2.566,93	13.408,57
6.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	2.435,40	1,66	4.042,76		1.217,70	-1.217,70	1.217,70	0,50	4.042,76			2.021,38	-2.021,38	2.021,38
6.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	1.238,20	1,66	2.055,41		619,10	-619,10	619,10	0,50	2.055,42			1.027,71	-1.027,71	1.027,71
6.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	1.376,40	1,66	2.284,82	1.376,40			1.376,40	1,00		2.284,82			2.284,82	2.284,82
6.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edmo Pasto e a Rua Arquimedes	M²	1.756,80	1,66	2.916,29	1.756,80		878,40	878,40	0,50		2.916,29		1.458,14	1.458,14	1.458,14
6.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	1.764,00	1,66	2.928,24		882,00	-882,00	882,00	0,50	2.928,24			1.464,12	-1.464,12	1.464,12
6.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	1.093,50	1,66	1.815,21		546,75	-546,75	546,75	0,50	1.815,22			907,61	-907,61	907,61
6.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	2.557,10	1,66	4.244,79	2.557,10		2.557,10	2.557,10	1,00		4.244,79			4.244,79	4.244,79
7	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A				265.068,64					0,71	159.152,87	105.915,73		77.447,55	28.468,23	187.621,10
7.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	T	217,51	248,18	53.981,63		65,25	-65,25	152,26	0,70	53.981,63			16.194,49	-16.194,49	37.787,14
7.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	T	154,78	248,18	38.413,30		46,43	-46,43	108,35	0,70	38.413,30			11.523,99	-11.523,99	26.889,31
7.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	T	103,23	248,18	25.619,62	103,23			103,23	1,00		25.619,62			25.619,62	25.619,62
7.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edmo Pasto e a Rua Arquimedes	T	131,76	248,18	32.700,20	131,76		65,88	65,88	0,50		32.700,20		16.350,10	16.350,10	16.350,10
7.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	T	132,30	248,18	32.834,21		66,15	-66,15	66,15	0,50	32.834,22			16.417,11	-16.417,11	16.417,11
7.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	T	136,69	248,18	33.923,72		68,35	-68,35	68,35	0,50	33.923,72			16.961,86	-16.961,86	16.961,86

Tomador: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Programa: PLANEJAMENTO URBANO (MCIDADES)

Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DE PATO BRANCO

Data da Medição:

8-dez-17

Período:

8-nov-17

8-dez-17

Data de Início do Empreendimento:

09/10/17

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADO
				UNIT.	TOTAL										
7.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	T	191,78	248,18	47.595,96	191,78		191,78	191,78	1,00		47.595,96		47.595,96	47.595,96
8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE,				2.264,21					0,71	1.359,51	304,71	661,57	243,15	1.602,66
8.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	87,00	5,30	461,10		26,10	-26,10	60,90	0,70	461,10		138,33	-138,33	322,77
8.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	61,91	5,30	328,12		18,57	-18,57	43,34	0,70	328,13		98,44	-98,44	229,69
8.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	41,29	5,30	218,84	41,29		41,29	41,29	1,00		218,84		218,84	218,84
8.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	M²	52,70	5,30	279,31	52,70	26,35	26,35	26,35	0,50		279,31	139,66	139,66	139,66
8.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	52,92	5,30	280,48		26,46	-26,46	26,46	0,50	280,48		140,24	-140,24	140,24
8.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	54,58	5,30	289,80		27,34	-27,34	27,34	0,50	289,80		144,90	-144,90	144,90
8.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	76,71	5,30	406,56	76,71		76,71	76,71	1,00		406,56		406,56	406,56
9	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA				1.726,54					0,72	1.158,06	568,47	483,68	34,79	1.242,85
9.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²XKM	426,31	0,93	396,47		127,89	-127,89	298,42	0,70	396,47		118,94	-118,94	277,53
9.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²XKM	297,17	0,93	276,37		89,15	-89,15	208,02	0,70	276,37		82,91	-82,91	193,46
9.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²XKM	128,01	0,93	119,05	128,01		128,01	128,01	1,00		119,05		119,05	119,05
9.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	M²XKM	84,33	0,93	78,43	84,33	42,17	42,16	42,16	0,50		78,43	39,22	39,21	39,21
9.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²XKM	259,31	0,93	241,16		129,66	-129,66	129,66	0,50	241,16		120,58	-120,58	120,58
9.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²XKM	262,44	0,93	244,07		131,22	-131,22	131,22	0,50	244,06		122,03	-122,03	122,03
9.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²XKM	398,91	0,93	370,99	398,91		398,91	398,91	1,00		370,99		370,99	370,99
10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE				11.293,35					0,94		11.293,35	634,94	10.658,42	10.658,42
10.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	109,46	19,58	2.143,23	109,46		109,46	109,46	1,00		2.143,23		2.143,23	2.143,23
10.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	86,52	19,58	1.694,06	86,52	8,65	77,87	77,87	0,90		1.694,06	169,41	1.524,66	1.524,66
10.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	79,90	19,58	1.564,44	79,90		79,90	79,90	1,00		1.564,44		1.564,44	1.564,44
10.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	M²	66,50	19,58	1.302,07	66,50	13,30	53,20	53,20	0,80		1.302,07	260,41	1.041,66	1.041,66
10.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	60,06	19,58	1.175,97	60,06		60,06	60,06	1,00		1.175,97		1.175,97	1.175,97
10.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	69,58	19,58	1.362,38	69,58		69,58	69,58	1,00		1.362,38		1.362,38	1.362,38
10.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	104,76	19,58	2.051,20	104,76	10,48	94,28	94,28	0,90		2.051,20	205,12	1.846,08	1.846,08
11	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA				2.227,44					0,94		2.227,44	140,24	2.087,20	2.087,20
11.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	1,60	233,73	373,97	1,60		1,60	1,60	1,00		373,97		373,97	373,97
11.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	1,00	233,73	233,73	1,00		1,00	1,00	1,00		233,73		233,73	233,73
11.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	1,91	233,73	446,42	1,91		1,91	1,91	1,00		446,42		446,42	446,42
11.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	M²	1,60	233,73	373,97	1,60	0,60	1,00	1,00	0,62		373,97	140,24	233,73	233,73
11.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	0,40	233,73	93,49	0,40		0,40	0,40	1,00		93,49		93,49	93,49
11.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	1,00	233,73	233,73	1,00		1,00	1,00	1,00		233,73		233,73	233,73
11.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	2,02	233,73	472,13	2,02		2,02	2,02	1,00		472,13		472,13	472,13
12	FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILINDRICA PLACA SIN.				6.022,78					1,00		6.022,78		6.022,78	6.022,78
12.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	UN.	8,00	130,93	1.047,44	8,00		8,00	8,00	1,00		1.047,44		1.047,44	1.047,44
12.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	UN.	5,00	130,93	654,65	5,00		5,00	5,00	1,00		654,65		654,65	654,65
12.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	UN.	9,00	130,93	1.178,37	9,00		9,00	9,00	1,00		1.178,37		1.178,37	1.178,37
12.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	UN.	8,00	130,93	1.047,44	8,00		8,00	8,00	1,00		1.047,44		1.047,44	1.047,44
12.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	UN.	2,00	130,93	261,86	2,00		2,00	2,00	1,00		261,86		261,86	261,86
12.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	UN.	5,00	130,93	654,65	5,00		5,00	5,00	1,00		654,65		654,65	654,65
12.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	UN.	9,00	130,93	1.178,37	9,00		9,00	9,00	1,00		1.178,37		1.178,37	1.178,37

Tomador: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
 Programa: PLANEJAMENTO URBANO (MCIDADES)
 Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DE PATO BRANCO

Data da Medição: 8-dez-17
 Período: 8-nov-17 8-dez-17
 Data de Início do Empreendimento: 09/10/17

#VALOR	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$ 389.143,74		NO PERÍODO	CLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	142.929,89	R\$ 142.929,89	R\$ 86.246,94	R\$ 56.682,96	R\$ 305.182,06
				UNIT.	TOTAL						ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	CLOSADO	EFETIVO	ACUMULADO
	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS														
13	ESCAVAÇÃO DE VALA NA ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA				2.095,79					1,00	2.095,79				2.095,79
13.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim)	M²	263,16	7,65	2.013,17				263,16	1,00	2.013,17				2.013,17
13.2	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano)	M²	10,80	7,65	82,62				10,80	1,00	82,62				82,62
14	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				4.010,39					1,00	4.010,39				4.010,39
14.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim)	M²	228,76	16,82	3.847,74				228,76	1,00	3.847,74				3.847,74
14.2	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano)	M²	9,67	16,82	162,65				9,67	1,00	162,65				162,65
15	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,				3.474,60					1,00	3.474,60				3.474,60
15.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim)	M	51,00	107,91	5.503,41				51,00	1,00	5.503,41				5.503,41
15.2	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano)	M	9,00	107,91	971,19				9,00	1,00	971,19				971,19
16	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,				17.016,12					1,00	17.016,12				17.016,12
16.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim)	M	99,00	171,88	17.016,12				99,00	1,00	17.016,12				17.016,12
17	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,				11.660,94					0,72	8.421,79				8.421,79
17.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim)	UN.	10,00	647,83	6.478,30				7,00	0,70	4.534,81				4.534,81
17.2	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau)	UN.	2,00	647,83	1.295,66				1,00	0,50	647,83				647,83
17.3	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pastore e a Rua Arquimedes)	UN.	2,00	647,83	1.295,66				2,00	1,00	1.295,66				1.295,66
17.4	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	UN.	2,00	647,83	1.295,66				2,00	1,00	1.295,66				1.295,66
17.5	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano)	UN.	2,00	647,83	1.295,66				1,00	0,50	647,83				647,83
18	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES				235,09					0,38	88,16				88,16
18.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim)	M	0,90	97,95	88,16										
18.2	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau)	M	0,60	97,95	58,77				0,30	0,50	29,39				29,39
18.3	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pastore e a Rua Arquimedes)	M	0,60	97,95	58,77				0,60	1,00	58,77				58,77
18.4	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano)	M	0,30	97,95	29,39										
19	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01				352,11					1,00		352,11		352,11	352,11
19.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim)	UN.	1,00	352,11	352,11	1,00		1,00	1,00	1,00		352,11		352,11	352,11
20	REPARO DE MEIO FIO, BOCA DE LOBO E ACESSIBILIDADE				1.073,08					1,00		1.073,08		1.073,08	1.073,08
20.1	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	UN.	2,00	539,04	1.078,08	2,00		2,00	2,00	1,00		1.078,08		1.078,08	1.078,08
21	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO				3.294,40					0,82	2.700,48				2.700,48
21.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim)	M	27,00	9,28	250,56										
21.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Arthur Bernardes +	M	6,00	9,28	55,68										
21.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau)	M	77,00	9,28	714,56				77,00	1,00	714,56				714,56
21.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pastore e a Rua Arquimedes)	M	85,00	9,28	788,80				63,00	0,74	584,64				584,64
21.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M	40,00	9,28	371,20				40,00	1,00	371,20				371,20
21.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M	75,00	9,28	696,00				70,00	0,93	649,60				649,60
21.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano)	M	45,00	9,28	417,60				41,00	0,91	380,48				380,48
22	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,				16.954,24					0,79	13.404,80				13.404,80
22.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim)	M	42,00	37,76	1.623,68										

Tomador: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Programa: PLANEJAMENTO URBANO (MCIIDADES)

Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DE PATO BRANCO

Data da Medição:

8-dez-17

Período:

8-nov-17

8-dez-17

Data de Início do Empreendimento:

09/10/17

#VALOR!	Declararam que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	142.929,89		R\$ 142.929,89	R\$ 86.246,94	R\$ 56.682,96	R\$ 305.182,06
				UNIT.	TOTAL					% ACUM	ACUM. ANTERIOR				
22.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M	13,00	37,76	490,88										
22.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M	81,00	37,76	3.058,56				81,00	1,00	3.058,56				3.058,56
22.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pastre e a Rua Arquimedes	M	115,00	37,76	4.342,40				93,00	0,81	3.511,68				3.511,68
22.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M	60,00	37,76	2.265,60				60,00	1,00	2.265,60				2.265,60
22.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M	84,00	37,76	3.171,84				72,00	0,86	2.718,72				2.718,72
22.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M	53,00	37,76	2.001,28				49,00	0,92	1.850,24				1.850,24
23	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO				370,63					0,50	185,34				185,34
23.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	1,00	61,78	61,78										
23.2	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	2,00	61,78	123,56				1,00	0,50	61,78				61,78
23.3	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	1,00	61,78	61,78										
23.4	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	1,00	61,78	61,78				1,00	1,00	61,78				61,78
23.5	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	1,00	61,78	61,78				1,00	1,00	61,78				61,78
Declararam que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.															

Responsável Técnico de(o/a) MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Carimbo e a AssinaturaMunicípio de Pato Branco
Frederico Demario Pimpão
Secretário de Engenharia e Obras
Port. 368/2014Responsável Executor
Carimbo e a Assinatura



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Arariqbolá, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharla@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Pato Branco, 08 de março de 2018

LAUDO DE LIBERAÇÃO

ENGº FREDERICO DEMARIO PIMPÃO
Secret. Engenharia e Obras

Siza Construtora Ltda - EPP
CNPJ Nº 06.907.354/0001-09
Contrato nº 59/2017/GP

Recebido em:	26, 03, 18
Horário:	17 horas 11 minutos
Secret. / Dpto:	
Assinatura:	hasongela

Recapeamento asfáltico sobre poliédrico, de trechos das Ruas Roal Carraro, Luiz Morelato, Das Andorinhas, Silva Jardim e Carlos Tumelero e recape sobre pavimento asfáltico em trechos da Roald Carraro e Arthur Bernardes

CONTRATO	100%		399.143,74	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1.ª Parcela em 25/01/2018	76,46%	305.182,01	23,54%	R\$ 93.961,73
A liberar 1.ª Parcela em 08/03/2018	23,36%	93.252,12	0,18%	R\$ 709,61


Valor a ser liberado em 08/03/2018 R\$ 93.252,12

O valor de R\$709,61 será suprimido definitivamente.


Comissão de Recebimento de Bens e Serviços (Decreto Nº 8.234 de 04/12/17)




Gilvan Augusto Nava



Alana Paula Mulhmann



Fernanda Zianni Manarim



Radimir Odler Comin



Jorge Eduardo Chioqueta



Claercio Gregorine



Ricardo Luiz Amarante Zilio



Comissão de Recebimento de Bens e Serviços

**Recapeamento asfáltico sobre poliédrico, de trechos
das Ruas Roald Carraro, Luiz Morelatto, Das
Andorinhas, Silva Jardim e Carlos Tumelero e recape
sobre pavimento asfáltico em trechos da Roald
Carraro e Arthur Bernardes**


CONTRATO 59/2017/GP

Relatório de Medição nº 02

Empresa Contratada: Siza Construtora Ltda

Responsável: Guilherme Elias Piassa – CREA PR 86745/D


Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a medição final, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:

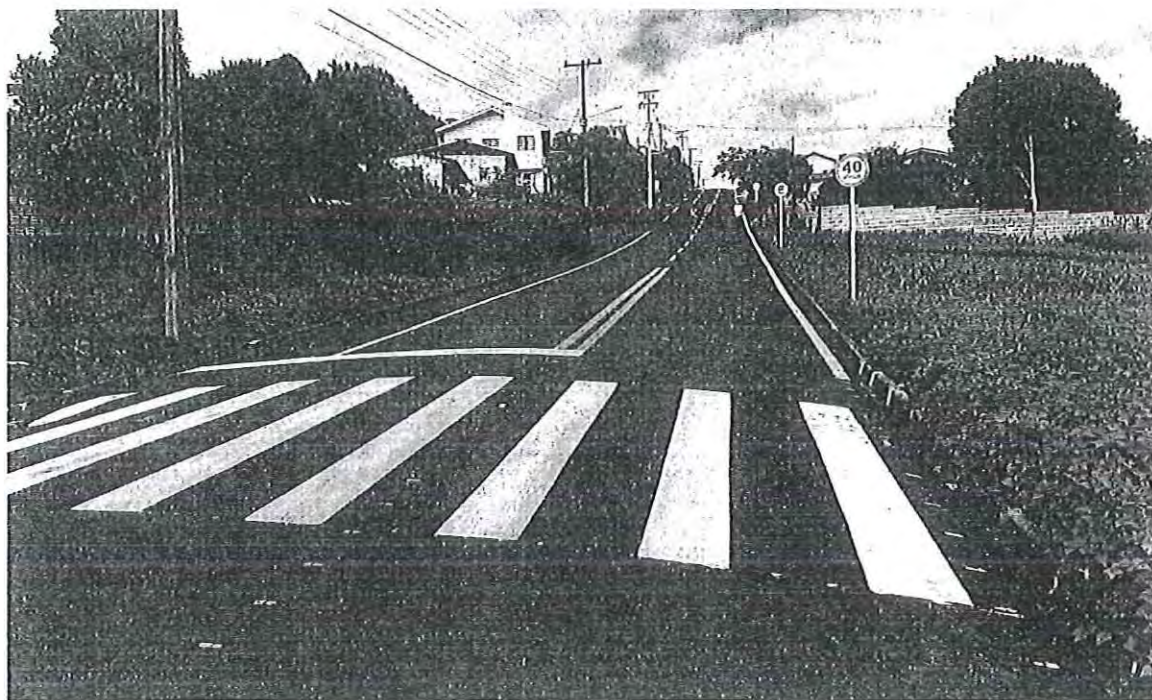


Fotografia 01–Rua Roald Carraro, entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim



Fotografia 02–Rua Roald Carraro, entre a Rua Aimoré e a Rua Arthur Bernardes

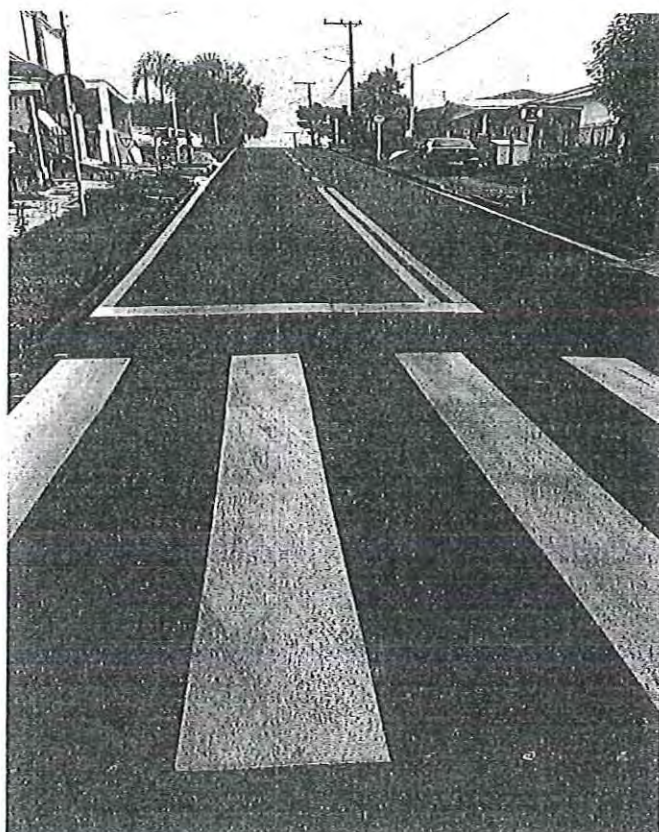


Fotografia 03 – Sinalização Horizontal e vertical da Rua das Andorinhas, entre a Édimo Pastro e a Rua Arquimedes

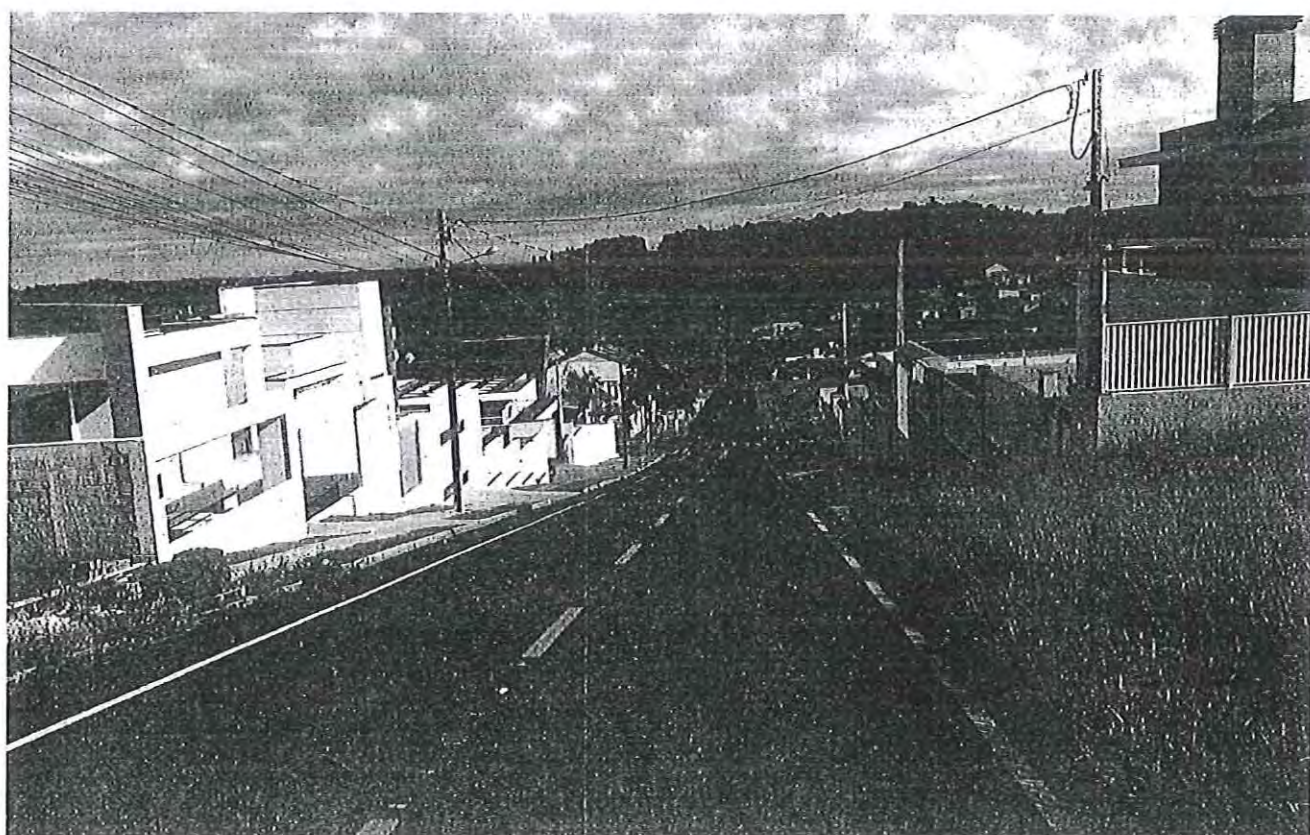

Fotografia 04–Rua Arthur Bernardes, entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro



Fotografia 05–Rua Carlos Tumelero, entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano Witiman

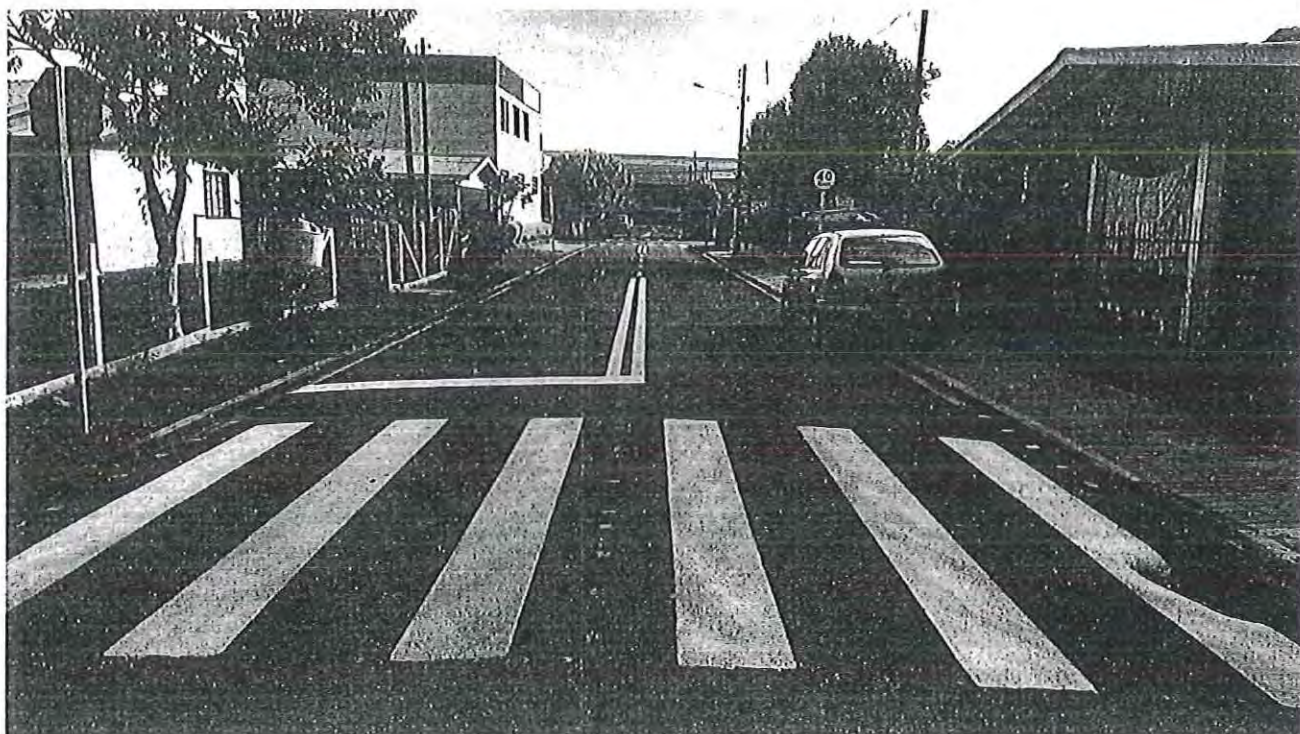


Fotografia 06 –Rua Luiz Morelato, entre Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau Fridz

Conforme Cláusula Décima Primeira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, com valor R\$ 709,61 a ser suprimido definitivamente.

Não havendo nada mais a comentar referente às medições do Contrato 59/2017/GP, segue parecer favorável a liberação de R\$ 93.252,12.

Pato Branco, 08 de Março de 2018.



Frederico Demario Pimpão
Eng. Civil CREA-PR 26.495/0-1

Município de Pato Branco
Frederico Demario Pimpão
Secretário de Engenharia e Obras
Port. 382/2014

Nº do contrato: 1034773-49 / 2016
Tomador: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Programa: PLANEJAMENTO URBANO (CIDADES)
Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DE PATO BRANCO

BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº: 3
Data da Medição: 7-fev-18
Período: 8-dez-17 7-fev-18
Data de Início do Empreendimento: 09/10/17

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADO
				UNIT.	TOTAL										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				888,83					1,00	888,83				888,83
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,50	355,53	888,83				2,50	1,00	888,83				888,83
	LIMPEZA, FRESA, REFORÇO DE BASE, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE														
2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA				13.725,09					1,00	13.725,09				13.725,09
2.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim)	M²	1.566,20	1,80	2.819,16				1.566,20	1,00	2.819,16				2.819,16
2.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	1.238,20	1,80	2.228,76				1.238,20	1,00	2.228,76				2.228,76
2.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	688,20	1,80	1.238,76				688,20	1,00	1.238,76				1.238,76
2.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	M²	878,40	1,80	1.581,12				878,40	1,00	1.581,12				1.581,12
2.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	882,00	1,80	1.587,60				882,00	1,00	1.587,60				1.587,60
2.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	1.093,50	1,80	1.968,30				1.093,50	1,00	1.968,30				1.968,30
2.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	1.278,55	1,80	2.301,39				1.278,55	1,00	2.301,39				2.301,39
3	FRESAGEM CONTINUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO				11.714,06					1,00	11.714,06				11.714,06
3.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim)	M³	20,91	128,91	2.695,51				20,91	1,00	2.695,51				2.695,51
3.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Arthur Bernardes +	M³	37,15	128,91	4.789,01				37,15	1,00	4.789,01				4.789,01
3.3	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M³	32,81	128,91	4.229,54				32,81	1,00	4.229,54				4.229,54
4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO				95,42					1,00	95,42				95,42
4.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim)	M³	20,91	1,05	21,96				20,91	1,00	21,96				21,96
4.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Arthur Bernardes +	M³	37,15	1,05	39,01				37,15	1,00	39,01				39,01
4.3	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M³	32,81	1,05	34,45				32,81	1,00	34,45				34,45
5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA				287,42					1,00	287,42				287,42
5.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim)	M³XKM	46,00	1,49	68,54				46,00	1,00	68,54				68,54
5.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Arthur Bernardes +	M³XKM	78,01	1,49	116,23				78,01	1,00	116,23				116,23
5.3	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M³XKM	68,89	1,49	102,65				68,89	1,00	102,65				102,65
6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO-RR-1C				20.287,52					1,00	13.408,56	6.878,96		6.878,96	20.287,52
6.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim)	M²	2.435,40	1,66	4.042,76	1.217,70		1.217,70	2.435,40	1,00	2.021,38	2.021,38		2.021,38	4.042,76
6.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	1.238,20	1,66	2.055,41	619,10		619,10	1.238,20	1,00	1.027,70	1.027,71		1.027,71	2.055,41
6.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	1.376,40	1,66	2.284,82				1.376,40	1,00	2.284,82				2.284,82
6.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	M²	1.756,80	1,66	2.916,29	878,40		878,40	1.756,80	1,00	1.458,15	1.458,14		1.458,14	2.916,29
6.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	1.764,00	1,66	2.928,24	882,00		882,00	1.764,00	1,00	1.464,12	1.464,12		1.464,12	2.928,24
6.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	1.093,50	1,66	1.815,21	546,75		546,75	1.093,50	1,00	907,60	907,61		907,61	1.815,21
6.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	2.557,10	1,66	4.244,79				2.557,10	1,00	4.244,79				4.244,79
7	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A				265.068,64					1,00	187.621,09	77.447,55		77.447,55	265.068,64
7.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Silva Jardim)	T	217,51	248,18	53.981,63	65,25		65,25	217,51	1,00	37.787,14	16.194,49		16.194,49	53.981,63
7.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Aimoré e a Rua Arthur Bernardes +	T	154,78	248,18	38.413,30	46,43		46,43	154,78	1,00	26.889,31	11.523,99		11.523,99	38.413,30
7.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	T	103,23	248,18	25.619,62				103,23	1,00	25.619,62				25.619,62
7.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	T	131,76	248,18	32.700,20	65,88		65,88	131,76	1,00	16.350,10	16.350,10		16.350,10	32.700,20
7.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	T	132,30	248,18	32.834,21	66,15		66,15	132,30	1,00	16.417,10	16.417,11		16.417,11	32.834,21
7.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	T	136,69	248,18	33.923,72	68,35		68,35	136,69	1,00	16.961,86	16.961,86		16.961,86	33.923,72

Tomador: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
 Programa: PLANEJAMENTO URBANO (MCIDADES)
 Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DE PATO BRANCO

Data da Medição: 7-fev-18
 Período: 8-dez-17 7-fev-18
 Data de Início do Empreendimento: 09/10/17

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADO
				UNIT.	TOTAL										
7.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	T	191,78	248,18	47.595,96				191,78	1,00	47.595,96				47.595,96
8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE,				2.264,21					1,00	1.602,64		661,57	661,57	2.264,21
8.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	87,00	5,30	461,10	26,10		26,10	87,00	1,00	322,77		138,33	138,33	461,10
8.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	61,91	5,30	328,12	18,57		18,57	61,91	1,00	229,68		98,44	98,44	328,12
8.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	41,29	5,30	218,84				41,29	1,00	218,84				218,84
8.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	M²	52,70	5,30	279,31	26,35		26,35	52,70	1,00	139,65		139,65	139,65	279,31
8.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	52,92	5,30	280,48	26,46		26,46	52,92	1,00	140,24		140,24	140,24	280,48
8.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	54,68	5,30	289,80	27,34		27,34	54,68	1,00	144,90		144,90	144,90	289,80
8.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	76,71	5,30	406,56				76,71	1,00	406,56				406,56
9	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA				1.726,54					1,00	1.242,86		483,68	483,68	1.726,54
9.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²XKM	426,31	0,93	396,47	127,89		127,89	426,31	1,00	277,53		118,94	118,94	396,47
9.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²XKM	297,17	0,93	276,37	89,15		89,15	297,17	1,00	193,46		82,91	82,91	276,37
9.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²XKM	128,01	0,93	119,05				128,01	1,00	119,05				119,05
9.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	M²XKM	84,33	0,93	78,43	42,17		42,17	84,33	1,00	39,22		39,22	39,22	78,43
9.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²XKM	259,31	0,93	241,16	129,66		129,66	259,31	1,00	120,58		120,58	120,58	241,16
9.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²XKM	262,44	0,93	244,07	131,22		131,22	262,44	1,00	122,04		122,04	122,04	244,07
9.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²XKM	398,91	0,93	370,99				398,91	1,00	370,99				370,99
10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE				11.293,35					1,00	10.658,41		634,94	634,94	11.293,35
10.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	109,46	19,58	2.143,23				109,46	1,00	2.143,23				2.143,23
10.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	86,52	19,58	1.694,06	8,65		8,65	86,52	1,00	1.524,65		169,41	169,41	1.694,06
10.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	79,90	19,58	1.564,44				79,90	1,00	1.564,44				1.564,44
10.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	M²	66,50	19,58	1.302,07	13,30		13,30	66,50	1,00	1.041,66		260,41	260,41	1.302,07
10.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	60,06	19,58	1.175,97				60,06	1,00	1.175,97				1.175,97
10.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	69,58	19,58	1.362,38				69,58	1,00	1.362,38				1.362,38
10.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	104,76	19,58	2.051,20	10,48		10,48	104,76	1,00	1.846,08		205,12	205,12	2.051,20
11	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA				2.227,44					1,00	2.087,20		140,24	140,24	2.227,44
11.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	1,60	233,73	373,97				1,60	1,00	373,97				373,97
11.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M²	1,00	233,73	233,73				1,00	1,00	233,73				233,73
11.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	1,91	233,73	446,42				1,91	1,00	446,42				446,42
11.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	M²	1,60	233,73	373,97	0,60		0,60	1,60	1,00	233,73		140,24	140,24	373,97
11.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	0,40	233,73	93,49				0,40	1,00	93,49				93,49
11.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	1,00	233,73	233,73				1,00	1,00	233,73				233,73
11.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	2,02	233,73	472,13				2,02	1,00	472,13				472,13
12	FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILINDRICA PLACA SIN.				6.022,78					1,00	6.022,78				6.022,78
12.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	UN.	8,00	130,93	1.047,44				8,00	1,00	1.047,44				1.047,44
12.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	UN.	5,00	130,93	654,65				5,00	1,00	654,65				654,65
12.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	UN.	9,00	130,93	1.178,37				9,00	1,00	1.178,37				1.178,37
12.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	UN.	8,00	130,93	1.047,44				8,00	1,00	1.047,44				1.047,44
12.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	UN.	2,00	130,93	261,86				2,00	1,00	261,86				261,86
12.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	UN.	5,00	130,93	654,65				5,00	1,00	654,65				654,65
12.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	UN.	9,00	130,93	1.178,37				9,00	1,00	1.178,37				1.178,37

Tomador: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Programa: PLANEJAMENTO URBANO (CIDADES)
Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DE PATO BRANCO

Data da Medição:	7-fev-18
Período:	8-dez-17 7-fev-18
Data de Início do Empreendimento:	09/10/17

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	UD	QUANT.	CONTRATADOS		QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
				R\$	399.143,74	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADO
	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS														
13	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA				2.095,79					1,00	2.095,79				2.095,79
13.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M³	263,16	7,65	2.013,17				263,16	1,00	2.013,17				2.013,17
13.2	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M³	10,80	7,65	82,62				10,80	1,00	82,62				82,62
14	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA				4.010,39					1,00	4.010,39				4.010,39
14.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M³	228,76	16,82	3.847,74				228,76	1,00	3.847,74				3.847,74
14.2	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M³	9,67	16,82	162,65				9,67	1,00	162,65				162,65
15	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS				6.474,60					1,00	6.474,60				6.474,60
15.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M	51,00	107,91	5.503,41				51,00	1,00	5.503,41				5.503,41
15.2	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M	9,00	107,91	971,19				9,00	1,00	971,19				971,19
16	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS				17.016,12					1,00	17.016,12				17.016,12
16.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M	99,00	171,88	17.016,12				99,00	1,00	17.016,12				17.016,12
17	BOCA P/BUEIRO SIMPLES-TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO				11.660,94					0,94	8.421,79	3.239,15	647,83	2.591,32	11.013,11
17.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	UN.	10,00	647,83	6.478,30	3,00		3,00	10,00	1,00	4.534,81	1.943,49		1.943,49	6.478,30
17.2	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	UN.	2,00	647,83	1.295,66	1,00		1,00	2,00	1,00	647,83	647,83		647,83	1.295,66
17.3	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	UN.	2,00	647,83	1.295,66		1,00	-1,00	1,00	0,50	1.295,66		647,83	-647,83	647,83
17.4	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	UN.	2,00	647,83	1.295,66				2,00	1,00	1.295,66				1.295,66
17.5	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	UN.	2,00	647,83	1.295,66	1,00		1,00	2,00	1,00	647,83	647,83		647,83	1.295,66
18	REMOCAO DE BUEIROS EXISTENTES				235,09					1,00	88,15	146,94		146,94	235,09
18.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M	0,90	97,95	88,16	0,90		0,90	0,90	1,00	88,15			88,16	88,16
18.2	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M	0,60	97,95	58,77	0,30		0,30	0,60	1,00	29,38	29,39		29,39	58,77
18.3	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	M	0,60	97,95	58,77				0,60	1,00	58,77				58,77
18.4	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M	0,30	97,95	29,39	0,30		0,30	0,30	1,00	29,39	29,39		29,39	29,39
19	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED. 01				352,11					1,00	352,11				352,11
19.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	UN.	1,00	352,11	352,11				1,00	1,00	352,11				352,11
20	REPARO DE MEIO FIO, BOCA DE LOBO E ACESSIBILIDADE														
20	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE				1.078,08					1,00	1.078,08				1.078,08
20.1	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	UN.	2,00	539,04	1.078,08				2,00	1,00	1.078,08				1.078,08
21	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO				3.294,40					1,00	2.700,48	593,92		593,92	3.294,40
21.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M	27,00	9,28	250,56	27,00		27,00	27,00	1,00		250,56		250,56	250,56
21.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M	6,00	9,28	55,68	6,00		6,00	6,00	1,00		55,68		55,68	55,68
21.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M	77,00	9,28	714,56				77,00	1,00	714,56				714,56
21.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edimo Pasto e a Rua Arquimedes	M	85,00	9,28	788,80	22,00		22,00	85,00	1,00	584,64	204,16		204,16	788,80
21.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M	40,00	9,28	371,20				40,00	1,00	371,20				371,20
21.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M	75,00	9,28	696,00	5,00		5,00	75,00	1,00	649,60	46,40		46,40	696,00
21.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M	45,00	9,28	417,60	4,00		4,00	45,00	1,00	380,48	37,12		37,12	417,60
22	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,				16.954,24					1,00	13.404,80	3.549,44		3.549,44	16.954,24
22.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M	43,00	37,76	1.623,68	43,00		43,00	43,00	1,00		1.623,68		1.623,68	1.623,68

Tomador: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
 Programa: PLANEJAMENTO URBANO (MCIDADES)
 Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DE PATO BRANCO

Data da Medição: 7-fev-18
 Período: 8-dez-17 7-fev-18
 Data de Início do Empreendimento: 09/10/17

#VALOR!	Declararamos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	UD	QUANT.	CONTRATADOS		QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
				R\$	399.143,74	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADO
22.2	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Arthur Bernardes +	M	13,00	37,76	490,88	13,00		13,00	13,00	1,00		490,88		490,88	490,88
22.3	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M	81,00	37,76	3.058,56				81,00	1,00	3.058,56				3.058,56
22.4	RUA DAS ANDORINHAS (entre a Rua Edmo Pastre e a Rua Arquimedes	M	115,00	37,76	4.342,40	22,00		22,00	115,00	1,00	3.511,68	830,72		830,72	4.342,40
22.5	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M	60,00	37,76	2.265,60				60,00	1,00	2.265,60				2.265,60
22.6	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M	84,00	37,76	3.171,84	12,00		12,00	84,00	1,00	2.718,72	453,12		453,12	3.171,84
22.7	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M	53,00	37,76	2.001,28	4,00		4,00	53,00	1,00	1.850,24	151,04		151,04	2.001,28
23	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO				370,68					0,83	185,34	185,34	61,78	123,56	308,90
23.1	RUA ROALD CARRARO (entre a Rua Almoré e a Rua Silva Jardim)	M²	1,00	61,78	61,78	1,00	1,00					61,78	61,78		
23.2	RUA LUIZ MORELATO (entre a Rua Ricardo B. Tesser e a Rua Estanislau	M²	2,00	61,78	123,56	1,00		1,00	2,00	1,00	61,78	61,78		61,78	123,56
23.3	RUA SILVA JARDIM (entre a Rua Roald Carraro e a Rua Nereu Ramos)	M²	1,00	61,78	61,78	1,00		1,00	1,00	1,00		61,78		61,78	61,78
23.4	RUA ARTHUR BERNARDES (entre a Rua Pedro Soares e a Rua Roald Carraro)	M²	1,00	61,78	61,78				1,00	1,00	61,78				61,78
23.5	RUA CARLOS TUMELEIRO (entre a Rua Bolislau Fidalski e a Rua Urbano	M²	1,00	61,78	61,78				1,00	1,00	61,78				61,78
Declararamos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.															

Responsável Técnico de(o)a MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
 Carimbo e a Assinatura

Município de Pato Branco
 Frederico Demario Pimpão
 Secretário de Engenharia e Obras
 Pdt. 368/2014

Responsável Executor
 Carimbo e a Assinatura

Representação Executiva Negocial de Governo Cascavel
Rua Souza Naves, 3891 – Bairro Centro
85.810-070 – Cascavel - PR

Ofício nº 0604 / 2018 / REGOV/CV

Cascavel, 7 de Março de 2018

A Sua Excelência o Senhor
Augustinho Zucchi
Prefeito de Pato Branco

Assunto: Autoriza saque da 2ª e última parcela com pendências para o desbloqueio no SICONV e orienta prestação de contas com devolução de saldo de repasse e rendimentos
Ref.: Contrato de Repasse OGU nº 834419/2016 - Operação 1034773-49 - Programa Planejamento Urbano / Ministério das Cidades
Objeto: Recapeamento Asfáltico sobre Pedras Poliédricas em Trechos das Ruas Roald Carraro, Luiz Morelato, das Andorinhas, Silva Jardim e Carlos Tumeleiro e Recape sobre Pavimento Asfáltico em Trechos das Ruas Roald Carraro e Arthur Bernardes
Conta corrente: 0602.006.00647260-7
Vigência: 14/08/2018

Senhor Prefeito Municipal,

1. A inspeção técnica realizada referente à solicitação desse Conveniente atestou a conclusão do objeto do Contrato de Repasse, e as informações referente a esta parcela constam abaixo:

Valor de Repasse	R\$ 92.391,33
Valor de Contrapartida	R\$ 6.342,12
Valor Total	R\$ 98.733,45

1.1 A solicitação de glosa definitiva dos itens 23.1 e 17.3, considerando que o Município irá desobstruir as bocas de lobo a glosa foi acatada.

1.2 A execução financeira considerando a operacionalização do contrato por OBTV será realizada exclusivamente no Portal de Convênios e após concluir os procedimentos para desbloqueio, completo registro e documentos de liquidação no SICONV, a inclusão do RRE na aba anexos, o aporte da contrapartida prevista para a parcela, a geração do relatório documento de liquidação incluídos e atendimento das pendências abaixo, comunicar a CAIXA via email para continuidade do processo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



2. Até o desbloqueio dos recursos no SICONV o Município deverá:
- Apresentar o Laudo de Controle Tecnológico dos serviços de pavimentação asfáltica e respectivos ensaios realizados conforme normativas do DNIT;
 - Prestar contas da 1ª parcela de recursos (anexar os comprovantes de pagamento dos tributos e gerar o relatório pagamentos realizados).
3. Tão logo o pagamento desta parcela esteja concluído, emitir o relatório de pagamentos realizados, sendo que após constar movimentação financeira concluída e o extrato estar atualizado, gerar os demais relatórios de execução (físico do plano de trabalho, financeiro do plano de trabalho e receitas e despesas), e comunicar esta REGOV por email quando do envio para análise, e somente após a aprovação dos relatórios de execução o Conveniente estará apto a iniciar o módulo prestação de contas.
4. A prestação de contas final será analisada no Portal de Convênios mediante comunicação à CAIXA, sendo que o Conveniente tem até 30 dias após a autorização de saque final e a finalização dos pagamentos para atualizar as informações e o devido registro do(s) documento(s), não sendo necessária a apresentação em meio físico.
5. Após aprovação dos relatórios de execução pela CAIXA, solicitar antecipação da vigência do contrato, se for o caso, utilizando a opção “Antecipação de prestação de contas” e concluir a atualização de todas as abas no módulo prestação de contas:
- Resgate de todo saldo remanescente, Repasse e rendimentos, por meio da funcionalidade “solicitar resgate saldo aplicação”;
 - Após constar saldo resgatado solicitar autorização para Devolução – aba Saldo Remanescente – opção 2 da devolução e comunicar o envio por email;
 - Após comunicação da REGOV Cascavel, o Tomador deverá incluir corretamente os valores informados e efetuar os procedimentos de inclusão e envio de OBTV, sendo que o valor de saldo de Repasse, se houver, deve ser devolvido integralmente à União e o saldo de rendimentos pode ser devolvido proporcionalmente;
 - Incluir na aba Anexos:
 - Declaração do Administrador Municipal de que notificou os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais acerca do repasse liberado de recursos OGU (Lei nº. 9.452, de 20/03/1997);
 - Envio da prestação de contas para análise, comunicando o envio por email.
- 5.1 O não atendimento ao prazo e a não inclusão dos registros no SICONV referente à prestação de contas poderá propiciar abertura de Tomada de Contas Especial por omissão do dever de prestar contas, de acordo com a legislação vigente - Diretriz MPOG nº 11/2011.
- 5.2 Após a conclusão do trâmite de Prestação de Contas no SICONV, e após a aprovação pela CAIXA e SIAFI, o Conveniente é comunicado por meio de ofício.

Respeitosamente,

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



FERNANDA KREUTZ DO NASCIMENTO FERRONATO
Assistente Pleno
RE NEG Governo Cascavel/PR

ANDRE YUKIO TAKABAYASHI
Coordenador de Filial Substituto Eventual
RE NEG Governo Cascavel/PR

RRE
Nº 3
Data emissão
07/02/2018
Ref. (Mês/Ano)
fev/2018

Relatório Resumo de Empreendimento

Nº do CTEF	BM	Item	Fotos (RAE Nº)
1	3		
2			
3			
4			
5			
6			
7			

OGU

☒ RRE - Tomador

☐ RRE - Validado (uso da CAIXA)

#00

Nº do CT
1034773-49 / 2016
Data do CT
Tomador
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Investimento
421.053,25
Agente Operador - Repasse
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Repasse
394.200,00
Fonte de Recursos
☒ OGU ☐ FGTS
Outras fontes
Contrapartida
26.853,25

CT - Programa
PLANEJAMENTO URBANO (MCIDADES)
CT - Modalidade
QCI - Data início vigência
09/10/2017
CT - Objeto

Discriminação dos itens/subitens invest.		Valores previstos no QCI (**)		Licitados	Saldo	Realizado no período (R\$)			Acumulado realizado incluindo o período					
Item	Descrição	%	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Repasse(R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	Repasse(R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	% Físico	% Financ	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,22	888,83	888,83	-				889,58	19,25	888,83	100,00	100,00	
2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	3,65	15.021,34	14.684,49	336,85				14.366,40	318,09	14.684,49	100,00	97,76	
3	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	2,85	11.714,06	13.775,33	-2.061,27					13.775,33	13.775,33	100,00	117,60	
4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	0,02	95,42	112,21	-16,79					112,21	112,21	100,00	117,60	
5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DMT = CONF.	0,07	287,42	337,45	-50,03					337,45	337,45	100,00	114,41	
6	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	4,93	20.287,52	21.172,30	-884,78	7.162,76	158,59	7.321,35	20.713,67	458,63	21.172,30	100,00	104,36	
7	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE	66,52	273.538,30	281.604,87	-8.066,57	80.623,32	1.785,10	82.408,42	275.504,84	6.100,03	281.604,87	100,00	102,95	
8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,	0,55	2.264,21	2.405,46	-141,25	688,69	15,25	703,94	2.353,35	52,11	2.405,46	100,00	106,24	
9	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA	0,42	1.726,54	1.845,51	-118,97	508,12	11,25	519,37	1.805,53	39,98	1.845,51	100,00	106,89	
10	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE	3,05	12.550,74	11.901,11	649,63	621,19	13,76	634,94	11.643,31	257,80	11.901,11	100,00	94,82	
11	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA	0,61	2.502,76	2.367,68	135,08	137,20	3,04	140,24	2.316,39	51,29	2.367,68	100,00	94,60	
12	FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILINDRICA PLACA SIN.	1,65	6.767,06	6.415,57	351,49				6.278,60	138,97	6.415,57	100,00	94,81	
13	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM	0,51	2.095,79	2.095,79					2.050,39	45,40	2.095,79	100,00	100,00	
14	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTENCIA: 111	0,08	4.010,39	4.010,39					3.923,52	86,87	4.010,39	100,00	100,00	
15	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO	1,57	6.474,60	6.474,60					6.334,35	140,25	6.474,60	100,00	100,00	
16	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO	4,14	17.016,12	17.016,12					16.647,52	368,60	17.016,12	100,00	100,00	
17	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO	2,84	11.680,94	11.680,94		2.535,19	56,13	2.591,32	10.774,55	238,56	11.013,11	94,44	94,44	
18	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	0,06	235,09	235,09		143,76	3,18	146,94		235,09	235,09	100,00	100,00	
19	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01	0,09	352,11	352,11						344,48	7,63	352,11	100,00	100,00
20	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	0,26	1.078,08	1.078,08						1.054,73	23,35	1.078,08	100,00	100,00
21	RETRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	0,80	3.294,40	3.294,40		581,05	12,87	593,92		3.294,40	3.294,40	100,00	100,00	
22	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	4,12	16.954,24	16.954,24		3.472,55	76,80	3.549,44	16.586,98	367,26	16.954,24	100,00	100,00	
23	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	0,09	370,68	370,68		120,88	2,68	123,56		308,90	308,90	83,33	83,33	
				</										

Observações Gerais

PATO BRANCO
quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018

Município de Pato Branco

Augustinho Zucchi
Prefeito Municipal (ou Tomador do OCU) MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Responsável Técnico do(a) MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Carimbo e Assinatura
Frederico Damiano Pimpão
Secretário de Engenharia e Obras
04/02/2018

Responsável Financeiro do(a) MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Carimbo e Assinatura
Mauro José Sbarain
Secretário de Administração e Finanças



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Ararigbola, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Pato Branco, 25 de janeiro de 2018

LAUDO DE LIBERAÇÃO

ENGº FREDERICO DEMARIO PIMPÃO
Secret. Engenharia e Obras


Siza Construtora Ltda - EPP
CNPJ Nº 06.907.354/0001-09
Contrato nº 59/2017/GP - Aditivo 01/2017

Recapetamento asfáltico sobre poliédrico, de trechos das Ruas Roal Carraro, Luiz Morelato, Das Andorinhas, Silva Jardim e Carlos Tumelero e recape sobre pavimento asfáltico em trechos da Roald Carraro e Arthur Bernardes

CONTRATO	100%		21.909,51	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1.ª Parcela em 25/01/2018	74,98%	16.428,18	25,02%	R\$ 5.481,33

Valor a ser liberado em 25/01/2018 R\$ 16.428,18

Comissão de Recebimento de Bens e Serviços (Decreto Nº 8.234 de 04/12/17)



Gilvan Augusto Nava




Fernanda Zianni Manarim

Férias

Jorge Eduardo Chioqueta



Ricardo Luiz Amarante Zilio



Alana Paula Mulhmann



Radimir Oden Comin



Claercio Gregorine

Município de Pato Branco
Autorizo, atendidas as
exigências legais

26 JAN. 2018



Augustinho Zucchi
Prefeito Municipal

Jorge
26/01



Comissão de Recebimento de Bens e Serviços

**Recapeamento asfáltico sobre poliédrico, de trechos
das Ruas Roald Carraro, Luiz Morelatto, Das
Andorinhas, Silva Jardim e Carlos Tumelero e recape
sobre pavimento asfáltico em trechos da Roald
Carraro e Arthur Bernardes**

CONTRATO 59/2017/GP

Relatório referente a medição do Aditivo 01

Empresa Contratada: Siza Construtora Ltda

Responsável: Guilherme Elias Piassa – CREA PR 86745/D

No dia 28 de dezembro de 2017, foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a medição do Aditivo 01, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra até o momento da vistoria:



Fotografia 01 - Rua Roald Carraro, entre a Rua Arthur Bernardes + 28,5 m e Rua Tocantins

Conforme Cláusula Décima Primeira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período de 60 meses.

Segue em anexo cópia dos Boletins de Medição, demonstrando os serviços executados nas referidas medições.

Não havendo nada mais a comentar referente às medições do Contrato 59/2017/GP e em conformidade com o Ofício nº 0115/2018/REGOV/CV da CAIXA segue parecer favorável a liberação de R\$321.610,19, sendo R\$16.428,18 referente ao Aditivo 01.

Pato Branco, 25 de Janeiro de 2018.


Frederico Demario Pimpão
Eng. Civil CREA-PR 26.495/0


Nº do contrato: 1034773-49 / 2016
 Tomador: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
 Programa: PLANEJAMENTO URBANO (CIDADES)
 Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº: 1
 Data da Medição: 8-nov-17
 Período: 12-abr-17 8-nov-17
 Data de Início do Empreendimento: 12/04/17

#VALOR	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	UD	QUANT.	CONTRATADOS		QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
				R\$		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA
				UNIT.	TOTAL										
	ITENS ADITADOS				21.909,51						20.768,72	R\$ 20.768,72	R\$ -	R\$ 20.768,72	R\$ 20.768,72
2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA				959,40					1,00		959,40		959,40	959,40
2.3	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	533,00	1,80	959,40	533,00		533,00	533,00	1,00		959,40		959,40	959,40
3	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO				2.061,27					1,00		2.061,27		2.061,27	2.061,27
3.4	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	15,99	128,91	2.061,27	15,99		15,99	15,99	1,00		2.061,27		2.061,27	2.061,27
4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO				16,79					1,00		16,79		16,79	16,79
4.4	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	T	15,99	1,05	16,79	15,99		15,99	15,99	1,00		16,79		16,79	16,79
5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA				50,03					1,00		50,03		50,03	50,03
5.4	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M³	33,58	1,49	50,03	33,58		33,58	33,58	1,00		50,03		50,03	50,03
6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C				884,78					1,00		884,78		884,78	884,78
6.3	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	533,00	1,66	884,78	533,00		533,00	533,00	1,00		884,78		884,78	884,78
7	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A				16.536,23					1,00		16.536,23		16.536,23	16.536,23
7.3	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	T	66,63	248,18	16.536,23	66,63		66,63	66,63	1,00		16.536,23		16.536,23	16.536,23
8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE,				141,25					1,00		141,25		141,25	141,25
8.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M³	26,65	5,30	141,25	26,65		26,65	26,65	1,00		141,25		141,25	141,25
9	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA				118,97					1,00		118,97		118,97	118,97
9.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M³XKM	127,92	0,93	118,97	127,92		127,92	127,92	1,00		118,97		118,97	118,97
10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE				607,76										
10.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	31,04	19,58	607,76										
11	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA				140,24										
11.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	0,60	233,73	140,24										
12	FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILINDRICA PLACA SIN.				392,79										
12.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	UN.	3,00	130,93	392,79										
Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.															

Responsável Técnico de(o/a) MUNICIPIO DE PATO BRANCO
 Carimbo e a Assinatura

Município de Pato Branco
 Frederico Damiano Pimpão
 Secretário de Engenharia e Obras
 Port. 268/2014

Responsável Executor
 Carimbo e a Assinatura

Nº do contrato: 1034773-49 / 2016
Tomador: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Programa: PLANEJAMENTO URBANO (MCIDADES)
Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº: 2
Data da Medição: 8-dez-17
Período: 8-nov-17 8-dez-17
Data de Início do Empreendimento: 12/04/17

#VALOR!	Declararamos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	1.140,79	R\$ 1.140,79	R\$ 5.481,32	R\$ (4.340,53)	R\$ 16.428,13
				UNIT.	TOTAL						ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADO
	ITENS ADITADOS														
2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA				959,40					1,00	959,40				959,40
2.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	533,00	1,80	959,40				533,00	1,00	959,40				959,40
3	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO				2.061,27					1,00	2.061,27				2.061,27
3.4	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	15,99	128,91	2.061,27				15,99	1,00	2.061,27				2.061,27
4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO				16,79					1,00	16,79				16,79
4.4	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	T	15,99	1,05	16,79				15,99	1,00	16,79				16,79
5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA				50,03					1,00	50,03				50,03
5.4	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M³	33,58	1,49	50,03				33,58	1,00	50,03				50,03
6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C				884,78					0,50	884,78		442,39	-442,39	442,39
6.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	533,00	1,66	884,78		266,50	-266,50	266,50	0,50	884,78		442,39	-442,39	442,39
7	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A				16.536,23					0,70	16.536,23		4.960,87	-4.960,87	11.575,36
7.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	T	66,63	248,18	16.536,23		19,99	-19,99	46,64	0,70	16.536,23		4.960,87	-4.960,87	11.575,36
8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE.				141,25					0,70	141,24		42,37	-42,37	98,87
8.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M³	26,65	5,30	141,25		8,00	-8,00	18,66	0,70	141,24		42,37	-42,37	98,87
9	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA				118,97					0,70	118,97		35,69	-35,69	83,28
9.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M³/KM	127,92	0,93	118,97		38,38	-38,38	89,54	0,70	118,97		35,69	-35,69	83,28
10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE				607,76					1,00	607,76				607,76
10.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	31,04	19,58	607,76	31,04		31,04	31,04	1,00	607,76				607,76
11	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA				140,24					1,00	140,24				140,24
11.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	0,60	233,73	140,24	0,60		0,60	0,60	1,00	140,24				140,24
12	FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILINDRICA PLACA SIN.				392,79					1,00	392,79				392,79
12.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	UN.	3,00	130,93	392,79	3,00		3,00	3,00	1,00	392,79				392,79

Declararamos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.

Responsável Técnico do(a) MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Carimbo e a Assinatura
Município de Pato Branco
Frederico Demario Pimpão
Secretário de Engenharia e Obras
Port. 368/2014

Responsável Executor
Carimbo e a Assinatura



Grau de
Sigilo
#PÚBLICO

Representação Executiva Negocial de Governo Cascavel
Rua Uruguai, 260 – Bairro Alto Alegre
85.805-010 – Cascavel - PR

Ofício nº 0115 / 2018 / REGOV/CV

Cascavel, 11 de Janeiro de 2018

A Sua Excelência o Senhor
Robson Cantu
Prefeito de Pato Branco

Assunto: Autoriza saque da 1ª parcela
Ref.: Contrato de Repasse OGU nº 834419/2016 - Operação 1034773-49 Planejamento Urbano - Ministério das Cidades
Objeto: Recapeamento Asfáltico sobre Pedras Poliédricas em Trechos das Ruas Roald Carraro, Luiz Morelato, das Andorinhas, Silva Jardim e Carlos Tumeleiro e Recape sobre Pavimento Asfáltico em Trechos das Ruas Roald Carraro e Arthur Bernardes
Conta corrente: 0602.006.00647260-7
Data vigência: 14/08/2018
Prazo envio de medição: entre os dias 16 e 22 de cada mês

Senhor Prefeito Municipal,

1. A inspeção técnica realizada referente à solicitação desse Conveniente atestou o percentual acumulado de 76,38 % e as informações referente a esta parcela constam abaixo:

Valor de Repasse	R\$ 301.099,06
Valor de Contrapartida	R\$ 20.511,13
Valor Total	R\$ 321.610,19

1.1 A execução financeira considerando a operacionalização do contrato por OBTV será realizada exclusivamente no Portal de Convênios.

1.2 Após concluir os procedimentos para desbloqueio, completo registro e documentos de liquidação no SICONV, o aporte da contrapartida prevista para a parcela e a geração do relatório documento de liquidação incluídos comunicar a CAIXA via email para continuidade do processo.

1.3 Salientamos que contrato em processo de aditivação no SICONV é impeditivo para movimentação financeira. Portanto aguardamos o retorno do Termo Aditivo de aumento da contrapartida financeira assinado pelo Prefeito e Testemunhas para finalização do trâmite.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



2. Na inspeção técnica foi objeto de glosa os itens abaixo relacionados:

Meta	Item orçam.	Itens Glosados Descrição	Unid.	Percentual Glosado (%)	Valor total do Item (R\$)	Valor Total Glosado (R\$)	Motivo da Glosa
1	6	PINTURA DE LIGAÇÃO	-	-	-	-	
1	6.1, 6.2, 6.4, 6.5 e 6.8	Rua Roald Carraro trechos 1 a 3, Rua das Andorinhas, Rua Silva Jardim e Rua Arthur Bernardes.	m²	50,00	14.642,69	7.321,35	ver observações abaixo
1	7	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ	-	-	-	-	
1	7.1, 7.2 e 7.8	Rua Roald Carraro - trechos 1, 2 e 3	T	30,00	108.931,16	32.679,35	qualidade insatisfatória
1	7.4	Rua das Andorinhas	T	50,00	32.700,20	16.350,10	ver observações abaixo
1	7.5	Rua Silva Jardim	T	50,00	32.834,21	16.417,11	qualidade insatisfatória
1	7.6	Rua Arthur Bernardes	T	50,00	33.923,72	16.961,86	ver observações abaixo
1	8	CARGA, MAN. E DESCARGAS DE CBUQ	-	-	-	-	
1	8.1, 8.2 e 8.8	Rua Roald Carraro - trechos 1, 2 e 3	m³	30,00	930,47	279,14	ver observações abaixo
1	8.4	Rua das Andorinhas	m³	50,00	279,31	139,66	ver observações abaixo
1	8.5	Silva Jardim	m³	50,00	280,48	140,24	ver observações abaixo
1	8.6	Rua Arthur Bernardes	m³	50,00	289,80	144,90	ver observações abaixo
1	9	TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA	-	-	-	-	
1	9.1, 9.2 e 9.8	Rua Roald Carraro - trechos 1, 2 e 3	m³ x Km	30,00	791,81	237,54	ver observações abaixo
1	9.4	Rua das Andorinhas	m³ x Km	50,00	78,43	39,22	ver observações abaixo
1	9.5	Silva Jardim	m³ x Km	50,00	241,16	120,58	ver observações abaixo
1	9.6	Rua Arthur Bernardes	m³ x Km	50,00	244,07	122,04	ver observações abaixo
1	10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	-	-	-	-	
1	10.2	Rua Roald Carraro - trecho 2	m²	10,00	1.694,06	169,41	não executado
1	10.4	Rua das Andorinhas	m²	20,00	1.302,07	260,41	desacordo com os projetos
1	10.7	Rua Carlos Tumeleiro	m²	10,00	2.051,20	205,12	não executado
1	11	PLACA DE SINALIZ. DE TRÂNSITO	-	-	-	-	
1	11.4	Rua das Andorinhas	m²	37,50	373,97	140,24	não executado
Total						91.728,27	

2.1 Observações:

- Diversos pontos com deformações, buracos se abrindo e demais patologias no pavimento das ruas Roald Carraro, Silva Jardim e Arthur Bernardes (glosa parcial dos serviços do item 7 - Fabricação e aplicação de CBUQ e seus sub-itens. E, por consequência os itens 6, 8 e 9 e sub-itens correspondentes.);
- Pedras irregulares aparecendo na Rua das Andorinhas, evidenciando que ou não executou a camada de capa asfáltica ou foi mal executada apresentando falhas na execução dessa camada;
- Sinalização horizontal de trânsito com execução incompleta e/ou em desacordo com especificações de projeto em partes das ruas Roald Carraro, Carlos Tumeleiro e Rua das Andorinhas;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



- Serviços glosados na inspeção anterior resolvidos, a exemplo da desobstrução de bocas de lobo (que estão com funcionalidade comprometida) e substituição de bocas de lobo não executadas.

3. Para a próxima autorização de saque o Município deverá apresentar:

- Inconsistência no Resumo de Medição nº 02 e consequentemente no RRE (acumulado até a etapa anterior está R\$ 276.982,57 ao invés de R\$ 269.267,78) e o BM nº 02 não está carimbado e assinado pelo responsável técnico registrado na ART nº 20175363481. Favor regularizar e enviar BM nº 02 devidamente assinado identificado e assinado;
- Providenciar ajustes na documentação dos BM nº 01 e 02 antes de emitir o BM nº 03, ver quadro acima dos serviços glosados no período. Informamos que as glosas do período anterior foram mantidas. Evolução correspondente a R\$ 52.342,41 (valor solicitado para desembolso no período R\$ 144.070,68 menos glosa de R\$ 91.728,27) e no acumulado R\$ 321.610,19.

4. Até a realização da próxima inspeção técnica o Município deverá:

- As duas rampas de acessibilidade previstas na Rua Arthur Bernardes devem ser instaladas em locais que sejam dotados de passeio público cujas dimensões e características sejam adequadas para garantir a acessibilidade;
- Por comprometer a segurança dos transeuntes e da circulação veicular, levantar grelhas de bocas-de-lobo que fiquem consideravelmente abaixo da cota do pavimento recapado;
- Consertar ou substituir grelhas e tampas de bueiros e bocas de lobo que estiverem quebrados com funcionalidade comprometida.

5. Até a realização da última inspeção técnica o Município deverá concluir os serviços de recomposição de pavimento nos trechos onde será executada a drenagem fora da área que receberá o recape, conforme Termo de Compromisso apresentado.

6. A prestação de contas desta parcela será realizada exclusivamente no SICONV, mediante a atualização das informações e o devido registro do(s) documento(s):

- No caso de retenção de tributos deve ser anexado comprovante de recolhimento das guias na aba Movimentações financeiras no módulo execução, acessar “detalhar” da respectiva guia e incluir documento aba “anexos”;
- Preencher o relatório Pagamentos Realizados da parcela, e enviar para análise, comunicando o envio.

Respeitosamente,

FERNANDA KREUTZ DO NASCIMENTO FERRONATO

Assistente Pleno

RE NEG Governo Cascavel/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



ANDERSON GIOVANI SIMON OLIVEIRA
Coordenador de Filial
RE NEG Governo Cascavel/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Ararigbola, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Pato Branco, 08 de março de 2018

LAUDO DE LIBERAÇÃO

ENGº FREDERICO DEMARIO PIMPÃO
Secret. Engenharia e Obras

Siza Construtora Ltda - EPP
CNPJ Nº 06.907.354/0001-09
Contrato nº 59/2017/GP - Aditivo 01/2017


Recebido em:	26, 03, 18
Horário:	18 horas 11 minutos
Secret. / Dpto:	
Assinatura:	Rosângela

Recapamento asfáltico sobre poliédrico, de trechos das Ruas Roal Carraro, Luiz Morelatto, Das Andorinhas, Silva Jardim e Carlos Tumelero e recape sobre pavimento asfáltico em trechos da Roald Carraro e Arthur Bernardes


CONTRATO	100%		21.909,51	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1.ª Parcela em 25/01/2018	74,98%	16.428,18	25,02%	R\$ 5.481,33
A liberar 1.ª Parcela em 08/03/2018	25,02%	5.481,33	0,00%	R\$ -


Valor a ser liberado em 08/03/2018 R\$ 5.481,33


Comissão de Recebimento de Bens e Serviços (Decreto Nº 8.234 de 04/12/17)



Gilvan Augusto Nava



Fernanda Zianni Manarim


Jorge Eduardo Chioqueta


Ricardo Luiz Amarante Zilio


Alana Paula Mulhmann


Radimir Odlen Comin


Claercio Gregorine



MUNICÍPIO DE

PATO BRANCO

Secretaria de Engenharia e
Obras

Rua Ararigbola, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharla@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Comissão de Recebimento de Bens e Serviços

**Recapeamento asfáltico sobre poliédrico, de trechos
das Ruas RoaldCarraro, Luiz Morelatto, Das
Andorinhas, Silva Jardim e Carlos Tumelero e recape
sobre pavimento asfáltico em trechos da Roald
Carraro e Arthur Bernardes**

CONTRATO 59/2017/GP


Relatório do Aditivo 01/2017

Empresa Contratada: Siza ConstrutoraLtda


Responsável: Guilherme Elias Piassa – CREA PR 86745/D

12/03/2018
Página 1 de 3

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar o aditivo 01/2017, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:

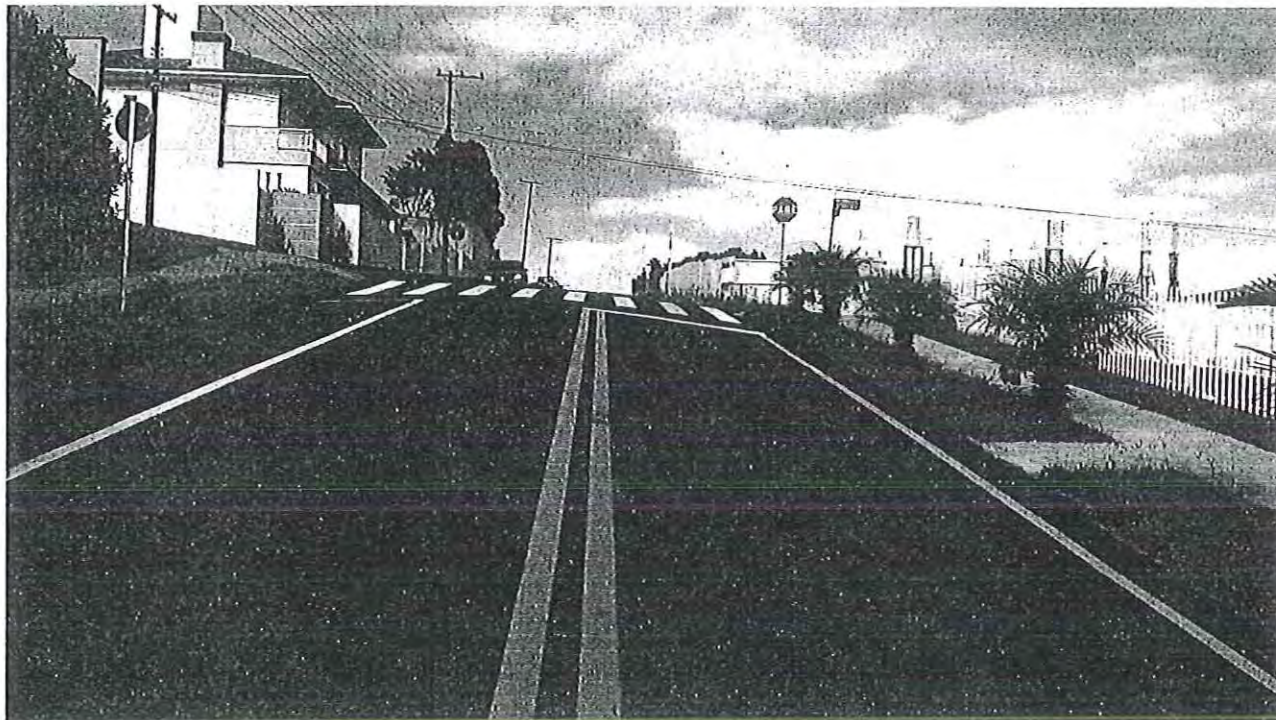

Fotografia 01–Rua Roald Carraro

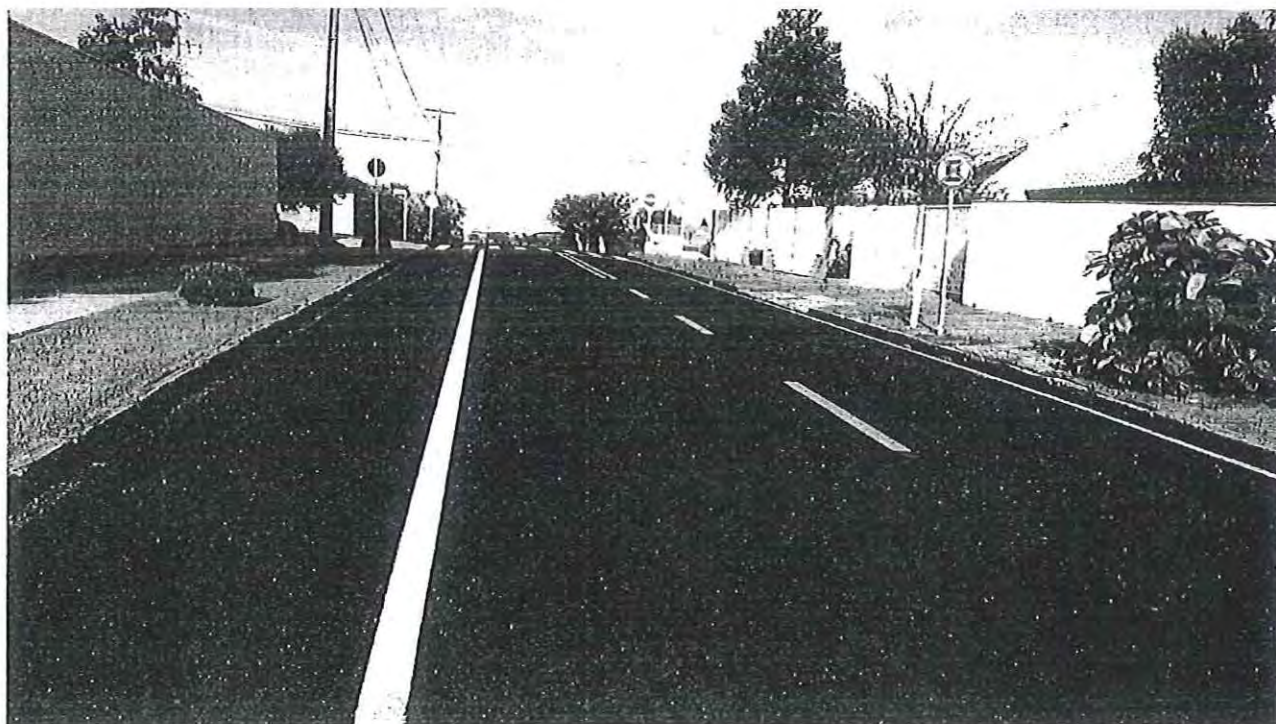

Fotografia 02–Rua Roald Carraro

Conforme Cláusula Décima Primeira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição.

Não havendo nada mais a comentar referente ao aditivo 01/2017 do Contrato 59/2017/GP, segue parecer favorável a liberação de R\$ 5.481,33.

Pato Branco, 08 de Março de 2018.


Frederico Demario Pimpão
Eng. Civil CREA-PR 26.495/D


Município de Pato Branco
Frederico Demario Pimpão
Secretário de Engenharia e Obras
Port. 358/2014

Nº do contrato: 1034773-49 / 2016

Tomador: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Programa: PLANEJAMENTO URBANO (MCIDADES)

Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº:

3

Data da Medição:

7-fev-18

Período:

8-dez-17

7-fev-18

Data de Início do Empreendimento:

12/04/17

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS								
		UD	QUANT.	R\$		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	5.481,32		R\$ 5.481,32		R\$ 5.481,32		R\$ 21.909,51	
				UNIT.	TOTAL						ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADO			
	ITENS ADITADOS																	
2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA				959,40					1,00	959,40							959,40
2.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	533,00	1,80	959,40				533,00	1,00	959,40							959,40
3	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO				2.061,27					1,00	2.061,27							2.061,27
3.4	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	15,99	128,91	2.061,27				15,99	1,00	2.061,27							2.061,27
4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO				16,79					1,00	16,79							16,79
4.4	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	T	15,99	1,05	16,79				15,99	1,00	16,79							16,79
5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA				50,03					1,00	50,03							50,03
5.4	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M³	33,58	1,49	50,03				33,58	1,00	50,03							50,03
6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C				884,78					1,00	442,39	442,39				442,39		884,78
6.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	533,00	1,66	884,78	266,50		266,50	533,00	1,00	442,39	442,39				442,39		884,78
7	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A				16.536,23					1,00	11.575,36	4.960,87				4.960,87		16.536,23
7.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	T	66,63	248,18	16.536,23	19,99		19,99	66,63	1,00	11.575,36	4.960,87				4.960,87		16.536,23
8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE,				141,25					1,00	98,88	42,37				42,37		141,25
8.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M³	26,65	5,30	141,25	8,00		8,00	26,65	1,00	98,88	42,37				42,37		141,25
9	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA				118,97					1,00	83,28	35,69				35,69		118,97
9.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M³XKM	127,92	0,93	118,97	38,38		38,38	127,92	1,00	83,28	35,69				35,69		118,97
10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE				607,76					1,00	607,76							607,76
10.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	31,04	19,58	607,76				31,04	1,00	607,76							607,76
11	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA				140,24					1,00	140,24							140,24
11.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	M²	0,60	233,73	140,24				0,60	1,00	140,24							140,24
12	FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILINDRICA PLACA SIN.				392,79					1,00	392,79							392,79
12.8	RUA ROALD CARRARO (entre Rua Arthur Bernardes + 28,5m e Rua Tocantins)	UN.	3,00	130,93	392,79				3,00	1,00	392,79							392,79
Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.																		

Responsável Técnico do(a) MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Carimbo e a Assinatura

Município de Pato Branco
Frederico Demario Pimpão
Secretário de Engenharia e Obras
Pato, 30/01/2014

Responsável Executor
Carimbo e a Assinatura

Representação Executiva Negocial de Governo Cascavel
Rua Souza Naves, 3891 – Bairro Centro
85.810-070 – Cascavel - PR

Ofício nº 0604 / 2018 / REGOV/CV

Cascavel, 7 de Março de 2018

A Sua Excelência o Senhor
Augustinho Zucchi
Prefeito de Pato Branco

Assunto: Autoriza saque da 2ª e última parcela com pendências para o desbloqueio no SICONV e orienta prestação de contas com devolução de saldo de repasse e rendimentos
Ref.: Contrato de Repasse OGU nº 834419/2016 - Operação 1034773-49 - Programa Planejamento Urbano / Ministério das Cidades
Objeto: Recapeamento Asfáltico sobre Pedras Poliédricas em Trechos das Ruas Roald Carraro, Luiz Morelato, das Andorinhas, Silva Jardim e Carlos Tumeleiro e Recape sobre Pavimento Asfáltico em Trechos das Ruas Roald Carraro e Arthur Bernardes
Conta corrente: 0602.006.00647260-7
Vigência: 14/08/2018

Senhor Prefeito Municipal,

1. A inspeção técnica realizada referente à solicitação desse Conveniente atestou a conclusão do objeto do Contrato de Repasse, e as informações referente a esta parcela constam abaixo:

Valor de Repasse	R\$ 92.391,33
Valor de Contrapartida	R\$ 6.342,12
Valor Total	R\$ 98.733,45

1.1 A solicitação de glosa definitiva dos itens 23.1 e 17.3, considerando que o Município irá desobstruir as bocas de lobo a glosa foi acatada.

1.2 A execução financeira considerando a operacionalização do contrato por OBTV será realizada exclusivamente no Portal de Convênios e após concluir os procedimentos para desbloqueio, completo registro e documentos de liquidação no SICONV, a inclusão do RRE na aba anexos, o aporte da contrapartida prevista para a parcela, a geração do relatório documento de liquidação incluídos e atendimento das pendências abaixo, comunicar a CAIXA via email para continuidade do processo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



2. Até o desbloqueio dos recursos no SICONV o Município deverá:
- Apresentar o Laudo de Controle Tecnológico dos serviços de pavimentação asfáltica e respectivos ensaios realizados conforme normativas do DNIT;
 - Prestar contas da 1ª parcela de recursos (anexar os comprovantes de pagamento dos tributos e gerar o relatório pagamentos realizados).
3. Tão logo o pagamento desta parcela esteja concluído, emitir o relatório de pagamentos realizados, sendo que após constar movimentação financeira concluída e o extrato estar atualizado, gerar os demais relatórios de execução (físico do plano de trabalho, financeiro do plano de trabalho e receitas e despesas), e comunicar esta REGOV por email quando do envio para análise, e somente após a aprovação dos relatórios de execução o Conveniente estará apto a iniciar o módulo prestação de contas.
4. A prestação de contas final será analisada no Portal de Convênios mediante comunicação à CAIXA, sendo que o Conveniente tem até 30 dias após a autorização de saque final e a finalização dos pagamentos para atualizar as informações e o devido registro do(s) documento(s), não sendo necessária a apresentação em meio físico.
5. Após aprovação dos relatórios de execução pela CAIXA, solicitar antecipação da vigência do contrato, se for o caso, utilizando a opção “Antecipação de prestação de contas” e concluir a atualização de todas as abas no módulo prestação de contas:
- Resgate de todo saldo remanescente, Repasse e rendimentos, por meio da funcionalidade “solicitar resgate saldo aplicação”;
 - Após constar saldo resgatado solicitar autorização para Devolução – aba Saldo Remanescente – opção 2 da devolução e comunicar o envio por email;
 - Após comunicação da REGOV Cascavel, o Tomador deverá incluir corretamente os valores informados e efetuar os procedimentos de inclusão e envio de OBTV, sendo que o valor de saldo de Repasse, se houver, deve ser devolvido integralmente à União e o saldo de rendimentos pode ser devolvido proporcionalmente;
 - Incluir na aba Anexos:
 - Declaração do Administrador Municipal de que notificou os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais acerca do repasse liberado de recursos OGU (Lei nº. 9.452, de 20/03/1997);
 - Envio da prestação de contas para análise, comunicando o envio por email.
- 5.1 O não atendimento ao prazo e a não inclusão dos registros no SICONV referente à prestação de contas poderá propiciar abertura de Tomada de Contas Especial por omissão do dever de prestar contas, de acordo com a legislação vigente - Diretriz MPOG nº 11/2011.
- 5.2 Após a conclusão do trâmite de Prestação de Contas no SICONV, e após a aprovação pela CAIXA e SIAFI, o Conveniente é comunicado por meio de ofício.

Respeitosamente,

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



FERNANDA KREUTZ DO NASCIMENTO FERRONATO

Assistente Pleno

RE NEG Governo Cascavel/PR

ANDRE YUKIO TAKABAYASHI

Coordenador de Filial Substituto Eventual

RE NEG Governo Cascavel/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATO BRANCO

OFÍCIO Nº. 479/2019/SMS

Pato Branco, 19 de setembro de 2019.

Excelentíssimo Senhor

Vilmar Maccari

Presidente da Câmara Municipal

Pato Branco – PR

Assunto: Ofício 692/2019 – Câmara de Vereadores

Exmo. Sr.

Em atenção ao Ofício supramencionado:

Requerimento 1937: Esclarecermos que o Município não possui monitoramento por Câmeras disponível, sendo as da UPA monitoradas pela Polícia Militar. Ainda a gestão destas instalações e parcerias não é feito por esta Secretaria de Saúde.

Sendo o que se cumpria para o momento, permaneço à disposição.


Marcia Fernandes de Carvalho
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Esporte e Lazer

Ofício nº 038/2019/SELPB

Pato Branco, 19 de setembro de 2019.

Senhor Presidente,

Encaminhamos a(s) resposta(s) da(s) proposições relativa(s) ao ofício nº 692/2019-DL:

Proposição nº 1928/2019

Resposta: Não estamos instalando novas ATIs, tendo em vista uma normativa do CREF, Conselho Regional de Educação Física, que exige o acompanhamento de um profissional de Educação Física junto as ATIs, o que inviabiliza novas instalações das mesmas.

Proposição nº 1932/2019

Resposta: Estaremos encaminhando esta solicitação para a Secretaria de Engenharia e Obras para realizar uma reforma nos referidos brinquedos.

Proposição nº 1939/2019

Resposta: Recebemos esta solicitação da Coordenação do CEU das Artes e do Esporte, e estamos argumentando com o Prefeito Municipal esta necessidade, contamos também com o vosso apoio.

Proposição nº 1947/2019

Resposta: Este serviço será executado em breve, aguardamos o andamento e início das obras pela Secretaria de Engenharia e Obras.

Respeitosamente,

PAULO VICENTE STEFANI
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

A Sua Senhoria o Senhor
Vilmar Macari
Presidente da Câmara de Vereadores
Pato Branco – Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Fone: (46) 3220-6087 3220-6088

E-mail: esporte@patobranco.pr.gov.br / esporte1@patobranco.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Agricultura

Ofício nº 31 / 2019

Pato Branco, 30 de setembro de 2019.

Senhor Presidente

Encaminhamos a resposta da proposição relativa ao Ofício nº 692/2018 de 17 de setembro de 2019.

Proposição no requerimento nº 1943 / 2019

Requer providências para manutenção do calçamento que dá acesso à Comunidade de São João Batista até o montante da ponte do Rio Pato Branco.

Resposta: - Informamos que a comunidade foi beneficiada com asfalto no campo e completando outro trecho da estrada com pedra irregulares (calçamento) até a ponte. Realiza com regularidade a manutenção da estrada sob sua responsabilidade.

Atenciosamente.

Secretaria de Agricultura
Prefeitura Municipal de Pato Branco


Secretaria Municipal de Agricultura
Valgino Kozellinski
Chefe da Div. de Departamento Rural
Engenheiro Agrônomo
CPF 188.953.289-20 - CREA-PR 61934-D
Pato Branco - PR

A Sua Excelência o Senhor
Vilmar Macari
Presidente da Câmara Municipal
Pato Branco – Pr.



MUNICÍPIO DE

PATO BRANCO

Secretaria de Administração e Finanças

Divisão de Fiscalização e Tributação

Memorando 044/2019

Para: Secretaria de Gabinete

De: Coordenação de Fiscalização / Tributação

Data: 27/09/2019

Assunto: Resposta Requerimento nº. 1934/2019 Câmara Municipal

Em resposta ao Requerimento nº. 1934/2019, enviado pela Câmara Municipal de Pato Branco, solicitando informações sobre os débitos pendentes dos imóveis Chácara nº. 71-A-1 e Chácara nº. 71-A-2 informamos que:

- Os débitos ainda não foram executados judicialmente;
- O Setor de Tributação está fazendo a cobrança via telefone, para os contribuintes com débitos pendentes com vencimentos no ano de 2015;
- Para este contribuinte foram tentados contatos através do telefone 046-3224-4751 nos dias 02 e 03/07/2019, o qual ninguém atende;
- Após o prazo para pagamento através do REFIS, os cadastros com débitos pendentes vencidos no ano 2015, que sejam superiores ou iguais a 15 UFM's, serão encaminhadas para execução fiscal, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 351, da Lei Complementar 001/1998.

Sem mais para o momento, estamos a disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente;

Pato Branco, 27 de setembro de 2019.


Julli Rebonatto

Chefe da Divisão de Fiscalização e Tributação

www.patobranco.pr.gov.br
